



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S604	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE COMPLEMENTARI - SEZIONE ODONTOTECNICO - SAVONA		Responsabile Briano Franca

Estrazione Controllo Fasi Attività

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE
COMPLEMENTARI - SEZIONE ODONTOTECNICO - SAVONA**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras**

**RESPONSABILE
Briano Franca**



Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011 S604

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE
COMPLEMENTARI/ SEZIONE ODONTOTECNICO - SAVONA**

Responsable
Briano Franca

OBIETTIVO: 2011 S604

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE COMPLEMENTARI - SEZIONE ODONTOTECNICO - SAVONA

RESPONSABILE: Briano Franca

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità
Progettazione definitiva	40,00	100,00	09/02/2011	30/03/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			09/02/2011	21/03/2011		
Note						
Progettazione esecutiva	30,00	100,00	01/04/2011	30/04/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			22/03/2011	19/07/2011		
Note						
Gara di appalto	5,00	100,00	01/05/2011	15/06/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			03/10/2011	15/11/2011		
Note						
Lavori	20,00		15/07/2011	15/10/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note						

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE
COMPLEMENTARI - SEZIONE ODONTOTECNICO - SAVONA**

Responsabile


Briano Franca

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva		
Collaudo e presa in carico	5,00		16/10/2011	20/12/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras

Note**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

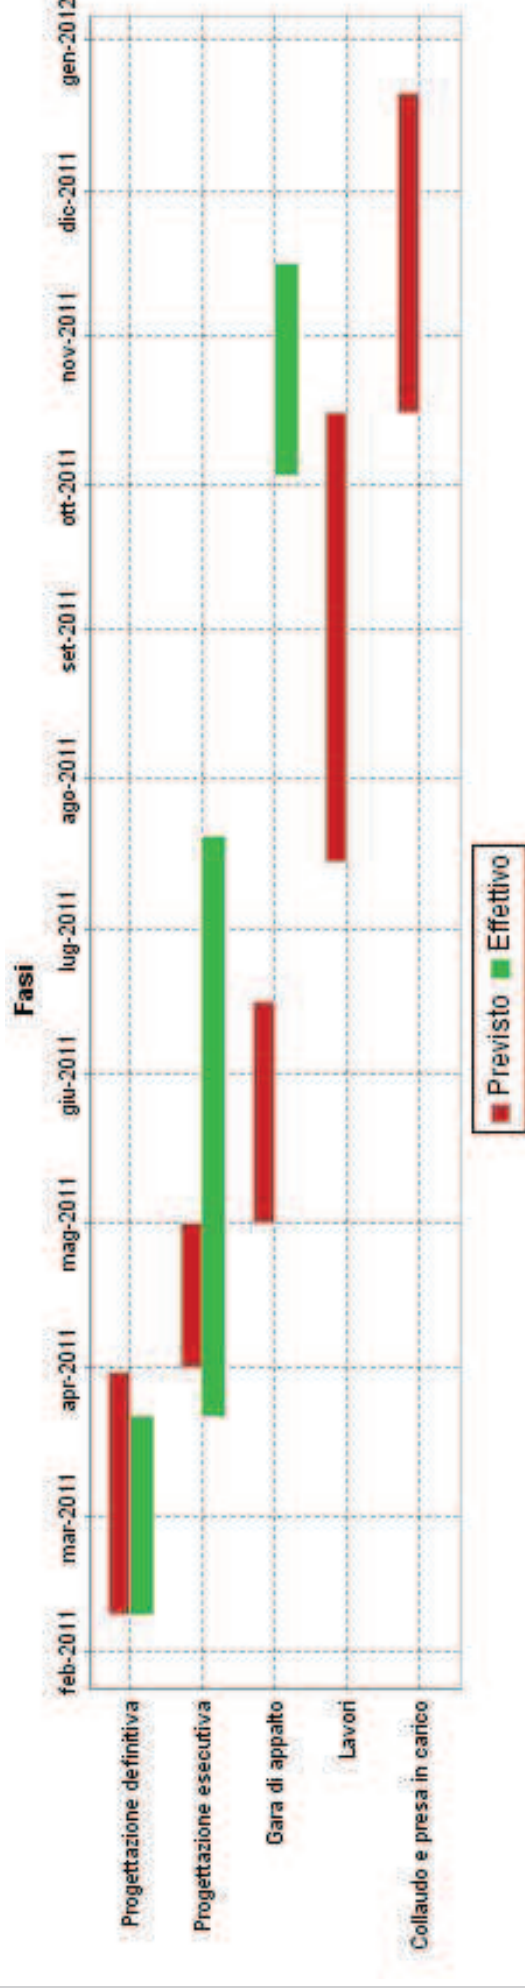GANTT**Relazione monitoraggio**



Assessorato

Guarnieri Rosalia

Centro di Responsabilità

S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_ S604

Responsabile

Briano Franca

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE COMPLEMENTARI - SEZIONE ODONTOTECNICO - SAVONA

Relazione al 09/05/2011

In data 29/04/2011 si è completata la stesura del progetto esecutivo. lo stesso è stato approvato con Determina Dirigenziale n 3291 del 09/05/2011

Relazione al 18/07/2011

Con Delibera di consiglio n 33 del 28 giugno 2011 (variazione di bilancio) è stata modificata la tipologia di finanziamento dell'opera (da mutuo a fondi propri Ente). Pertanto è stato ritirato il progetto esecutivo e ad oggi si sta provvedendo ad una nuova approvazione. Il progetto è stato inoltre modificato in alcune sue componenti (capitolato d'appalto) vista l'entrata in vigore del nuovo regolamento sui lavori pubblici.

Per le motivazioni sopra riportate si potrà procedere all'espertamento della gara solo dopo la conclusione del progetto esecutivo, in fase d'approvazione in questi giorni

Relazione al 29/09/2011

A seguito di quanto previsto dalla Legge n 106 del 12 luglio 2011 in merito all'estrapolazione dei costi della mano d'opera dagli importi a base d'appalto dei lavori e dalla Legge del 14 settembre 2011 sulla modifica dell'aliquota IVA dal 20 al 21% si è provveduto, con Determina Dirigenziale n 6632 del 29/09/2011 alla riapprovazione del progetto esecutivo

Relazione al 15/11/2011

Con gara ufficiosa del 15/11/2011 sono stati affidati i lavori alla Ditta Cerbone Serramenti.

Viste le tempistiche di riapprovazione della progettazione e quelle di esperimento della gara ufficiosa si prevede un inizio dei lavori (a seguito di perfezionamento del contratto) nella primavera 2012

Relazione al 31/12/2011

Ad oggi non risulta ancora stipulato il contratto con la Ditta aggiudicataria dell'appalto. Si presume comunque un inizio lavori nella primavera.



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S605	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE COMPLEMENTARI - PLESSO VIA CABOTO - SAVONA		Responsabile Briano Franca

Estrazione Controllo Fasi Attività

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE
COMPLEMENTARI - PLESSO VIA CABOTO - SAVONA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Briano Franca



2011 S605

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE
COMPLEMENTARI- PLESSO VIA CABOTO - SAVONA**

Responsabile
Briano Franca

OBIETTIVO: 2011 S605

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE COMPLEMENTARI - PLESSO VIA CABOTO - SAVONA

RESPONSABILE: Briano Franca

FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Responsabile	Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	40,00	100,00	09/02/2011		30/03/2011		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			09/02/2011		29/03/2011			
Note								
Progettazione esecutiva	30,00	100,00	01/04/2011		30/04/2011		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			01/04/2011			19/07/2011		
Note								
Gara di appalto	5,00	100,00	01/05/2011		15/06/2011		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
				20/10/2011		01/12/2011		
Note								
Lavori	20,00		15/07/2011		15/10/2011		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
								
Note								

Assessorato
Guarnieri Rosalia


2011_S605

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE
COMPLEMENTARI - PLESSO VIA CABOTO - SAVONA**Responsabile
Brianco Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva	Responsabile	
Collaudo e presa in carico	5,00		16/10/2011		20/12/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note							

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

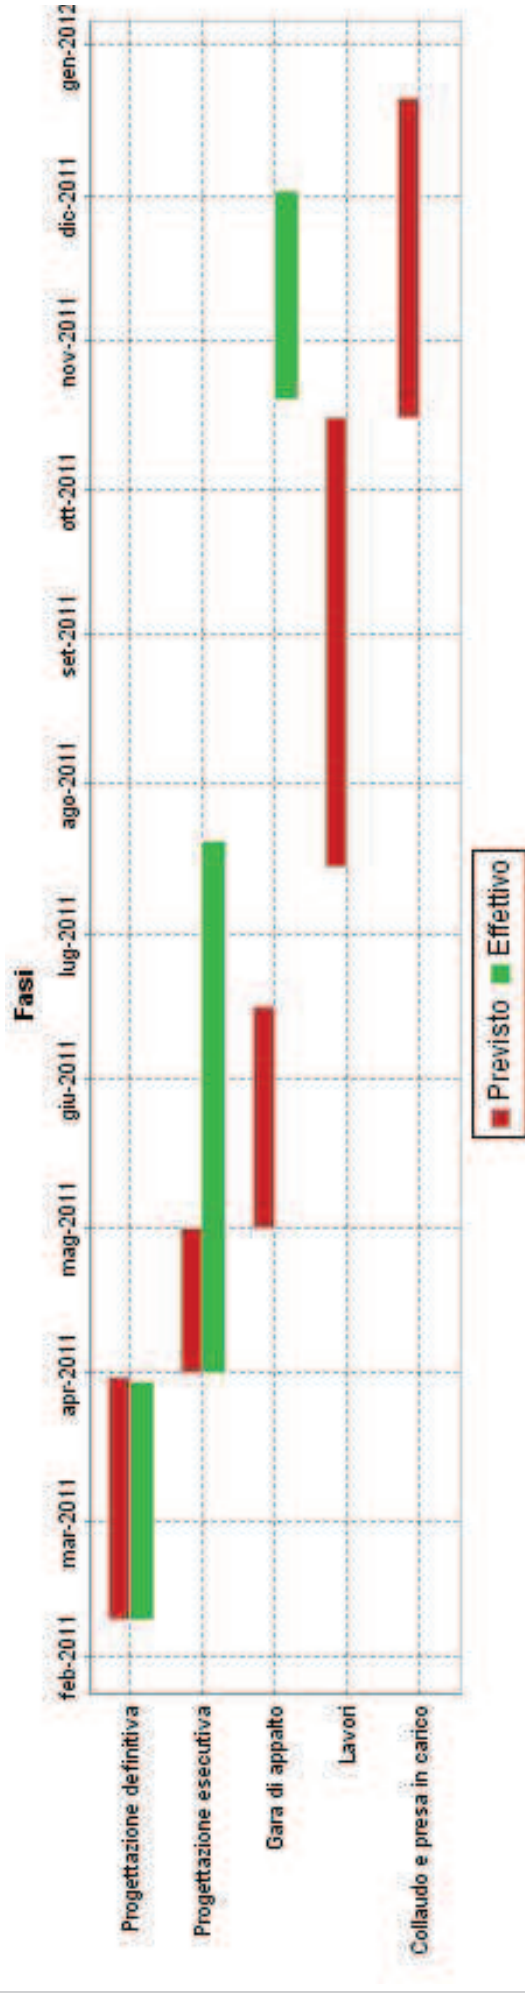GANTT



Assessorato
Guarnieri Rosalia

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_ S605

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DI EMERGENZA - OPERE COMPLEMENTARI - PLESSO VIA CABOTO - SAVONA

Responsabile
Briano Franca

Relazione al 09/05/2011

In data 29/04/2011 si è completata la stesura del progetto esecutivo. lo stesso è stato approvato con Determina Dirigenziale n 3290 del 09/05/2011

Relazione al 18/07/2011

Con Delibera di consiglio n 33 del 28 giugno 2011 (variazione di bilancio) è stata modificata la tipologia di finanziando dell'opera (da mutuo a fondi propri). Pertanto è stato ritirato il progetto esecutivo e ad oggi si sta provvedendo ad una nuova approvazione. il progetto medesimo è stato inoltre modificato in alcune sue componenti (capitolato d'appalto) vista l'entrata in vigore del nuovo regolamento sui lavori pubblici.

Per le motivazioni sopra riportate si potrà procedere all'espertamento della gara solo dopo la conclusione del progetto esecutivo, in fase d'approvazione in questi giorni.

Relazione al 19/10/2011

A seguito di quanto previsto dalla Legge n 106 del 12 luglio 2011 in merito all'estrapolazione dei costi della mano d'opera dagli importi a base d'appalto dei lavori e dalla Legge del 14 settembre 2011 sulla modifica dell'aliquota IVA dal 20 al 21% si è provveduto, con Determina Dirigenziale n 7200 del 19/10/2011 alla riapprovazione del progetto esecutivo

Relazione al 01/12/2011

Con gara ufficiosa del 01/12/2011 sono stati affidati i lavori alla Ditta Caprio Infissi

Viste le tempistiche di riapprovazione della progettazione e quelle di esperimento della gara ufficiosa si prevede un inizio dei lavori (a seguito di perfezionamento del contratto) nella primavera 2012

Relazione al 31/12/2011

Ad oggi non risulta ancora stipulato il contratto con la Ditta aggiudicataria dell'appalto. Si presume comunque un inizio lavori nella primavera.



2011_S606	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - PLESSO SCOALSTICO DI VIA MANTONI-VIA AONZO - SAVONA		Responsabile Briano Franca

Estrazione Controllo Fasi Attività

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - PLESSO SCOALSTICO DI VIA
MANTONI-VIA AONZO - SAVONA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Briano Franca

**OBIETTIVO: 2011 S606**

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - PLESSO SCOALSTICO DI VIA MANTONI-VIA AONZO - SAVONA

RESPONSABILE: Briano Franca

FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Responsabile	Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	40,00	100,00	09/02/2011		30/03/2011		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			09/02/2011		29/03/2011			
Note								
Progettazione esecutiva	30,00	100,00	01/04/2011		30/04/2011		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			31/03/2011			18/07/2011		
Note								
Gara di appalto	5,00	100,00	01/05/2011		15/06/2011		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
				26/09/2011		21/11/2011		
Note								
Lavori	20,00		15/07/2011		15/10/2011		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note								

Assessorato
Guarnieri RosaliaCentro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras


2011_S606

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - PLESSO SCOALSTICO DI VIA MANTONI-VIA AONZO - SAVONAResponsabile
Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva	Responsabile	
Collaudo e presa in carico	5,00		16/10/2011		20/12/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note							

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

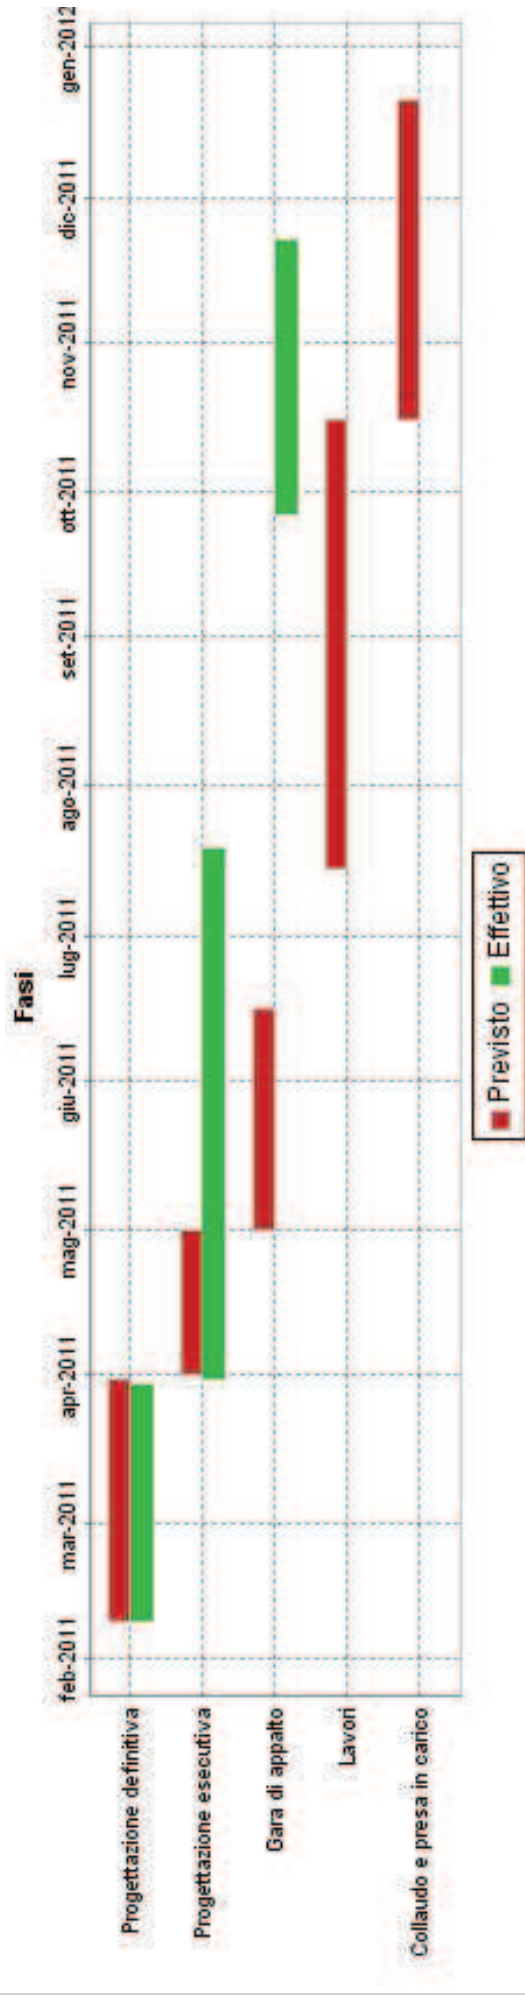GANTT**Relazione monitoraggio**



2011_ S606	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
		Responsabile Briano Franca

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - PLESSO SCOALSTICO DI VIA MANTONI-VIA AONZO - SAVONA

Relazione al 09/05/2011

In data 29/04/2011 si è completata la stesura del progetto esecutivo. lo stesso è stato approvato con Determina Dirigenziale n 3289 del 09/05/2011

Relazione al 18/07/2011

Con Delibera di consiglio n 33 del 28 giugno 2011 (variazione di bilancio) è stata modificata la tipologia di finanziamento dell'opera (da mutuo a fondi propri). Pertanto è stato ritirato il progetto esecutivo (già approvato a maggio dell'anno corrente) e ad oggi si sta provvedendo ad una nuova approvazione. Il progetto medesimo è stato inoltre modificato in alcune sue componenti (capitolato d'appalto) vista l'entrata in vigore del nuovo regolamento sui lavori pubblici.

Per le motivazioni sopra riportate si potrà procedere all'espertamento della gara solo dopo la conclusione del progetto esecutivo, in fase d'approvazione in questi giorni

Relazione al 23/09/2011

A seguito di quanto previsto dalla Legge n 106 del 12 luglio 2011 in merito all'estrapolazione dei costi della mano d'opera dagli importi a base d'appalto dei lavori e dalla Legge del 14 settembre 2011 sulla modifica dell'aliquota IVA dal 20 al 21% si è provveduto, con Determina Dirigenziale n 6502 del 23/09/2011 alla riapprovazione del progetto esecutivo

Relazione al 21/11/2011

Con gara ufficiosa del 21/11/2011 sono stati affidati i lavori alla Ditta Cerbone Serramenti

Viste le tempistiche di riapprovazione della progettazione e quelle di esperimento della gara ufficiosa si prevede un inizio dei lavori (a seguito di perfezionamento del contratto) nella primavera 2012

Relazione al 31/12/2011

Ad oggi non risulta ancora stipulato il contratto con la Ditta aggiudicataria dell'appalto. Si presume comunque un inizio lavori nella primavera.



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S607	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZ. ALBERGHIERO - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA		Responsabile Briano Franca

Estrazione Controllo Fasi Attività

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZ. ALBERGHIERO -
REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Briano Franca



2011 S607

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZ. ALBERGHIERO -
REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA**

OBIETTIVO: 2011 S607

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZ. ALBERGHIERO - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA

RESPONSABILE: Briano Franca

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Responsabile		
Progettazione definitiva	40,00	100,00	08/02/2011	31/07/2011	Briano Franca		S6 - Viab./Strutt./Infras
			08/02/2011				
	Note						
Progettazione esecutiva	30,00		01/08/2011	30/11/2011	Briano Franca		S6 - Viab./Strutt./Infras
							
Note							
Vedi relazione al 30/11/2011							
Gara di appalto	5,00		01/12/2011	31/01/2012	Briano Franca		S6 - Viab./Strutt./Infras
							
Note							
Lavori	20,00		15/02/2012	31/05/2012	Briano Franca		S6 - Viab./Strutt./Infras
							
Note							

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZ. ALBERGHIERO -
REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA**


Responsabile

Briano Franca

FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Responsabile	Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva			
Collaudo e presa in carico	5,00		01/06/2012		15/07/2012		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note								

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

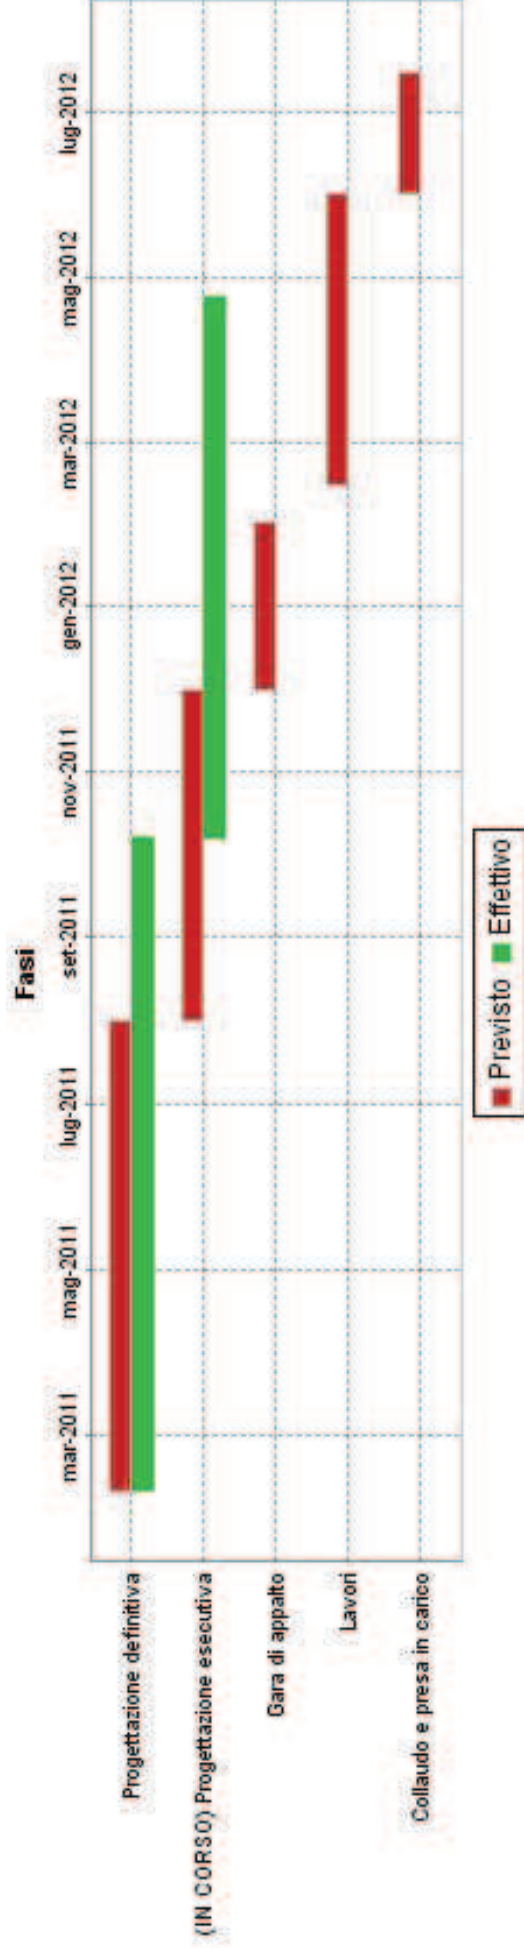GANTT



2011_S607	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZ. ALBERGHIERO - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI EMERGENZA		
Relazione al 30/11/2011 Il progetto esecutivo potrà essere predisposto solo dopo l'ottenimento del parere da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici, in quanto trattasi di intervento da effettuarsi su immobile vincolato. la richiesta di parere è stata inviata in data 26/10/2011 con n. prot. 78308 e si è in attesa di risposta		
Realzione al 31/12/2011 Ad oggi non è ancora pervenuto il parere della Sovrintendenza ai Beni culturali. pertanto si è impossibilitati a redigere il progetto esecutivo		



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato

Guarnieri Rosalia

2011_S608

Centro di Responsabilità

S6 - Viab./Strutt./Infras

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI ALBENGA

Responsabile

Briano Franca

Estrazione Controllo Fasi Attività

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI ALBENGA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Briano Franca



2011_S608	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI ALBENGA		Responsabile Briano Franca

OBIETTIVO: 2011_S608
REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI ALBENGA
RESPONSABILE: Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva	Responsabile	
Revisione progettazione preliminare	70,00	100,00	25/11/2010		31/05/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			25/11/2010		03/05/2011		
Note							
Verifica periodica realizzabilità obiettivo	30,00	100,00	01/06/2011		30/06/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			04/05/2011		23/05/2011		
Note							

INDICATORI			
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
			Note



Assessorato
Guarnieri Rosalia


Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_S608

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI ALBENGA

Responsabile
Briano Franca

GANTT

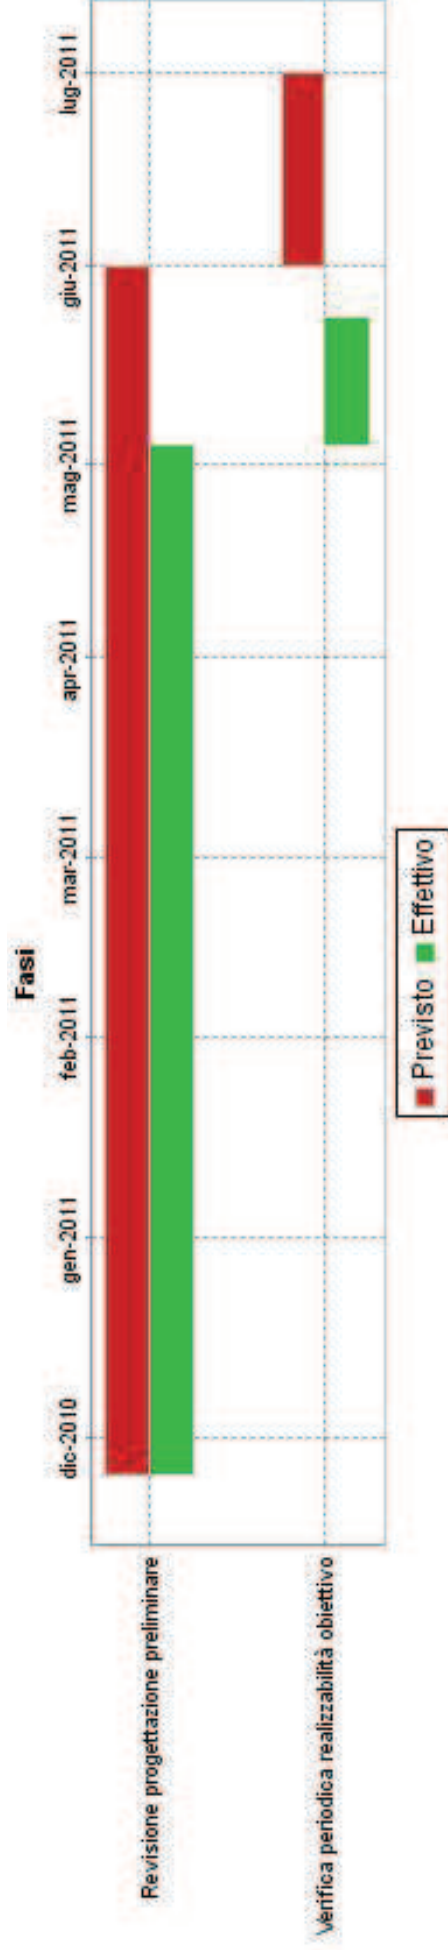

Relazione monitoraggio

Relazione al 3 maggio 2011

In data 03/05/2011 i progettisti, incaricati della revisione del progetto preliminare, hanno consegnato la relativa documentazione. L'importo complessivo dell'intervento è stimato in euro 38.279.960,00

Relazione al 30 giugno 2011

Al seguito dell'esame della documentazione relativa al completamento del progetto preliminare, l'ufficio ha predisposto nota inviata all'esame della Giunta in data 20/05/2011 (esaminata dall'Giunta in data 23/05/2011), richiedendo indicazioni per la prosecuzione dell'intervento. La Giunta provinciale ha rinviato tale decisione all'esito di apposita riunione ad oggi non ancora effettuata.

Realzione al 31/12/2011

Per il giorno 02/01/2012 è stato fissato un incontro con il Comune di Albenga al fine di definire le competenze sull'intervento.



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato
Mattea Carla

2011_S609

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

**INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI ED EDIFICI PROVINCIALI DI CUI ALL'ART. 125 DEL
D.LGS. 163/2006**

Responsabile
Briano Franca

Estrazione Controllo Fasi Attività

**INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI ED EDIFICI PROVINCIALI DI CUI ALL'ART.
125 DEL D.LGS. 163/2006**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras**

**RESPONSABILE
Briano Franca**



2011_S609	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI ED EDIFICI PROVINCIALI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006		Responsabile Briano Franca

OBIETTIVO: 2011_S609
INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI ED EDIFICI PROVINCIALI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006
RESPONSABILE: Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva		
Individuazione preventiva, laddove possibile, quadro d'assieme degli interventi da attuarsi nel corso dell'esercizio 2011 (prevedibili) e individuazione degli importi da mantenere a disposizione (interventi non prevedibili).	30,00	100,00	08/02/2011		15/04/2011	Briano Franca	
			08/02/2011		08/04/2011		
Note							
Vedi relazione all'8 aprile 2011							
Monitoraggio finale consuntivo	70,00	100,00	30/11/2011		31/12/2011	Briano Franca	
			30/11/2011		30/12/2011		
S6 - Viab./Strutt./Infras							
Note							
Vedi relazione al 30/12/2011							

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato
Mattea Carla


Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_S609

INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI ED EDIFICI PROVINCIALI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006

Responsabile
Briano Franca

GANTT

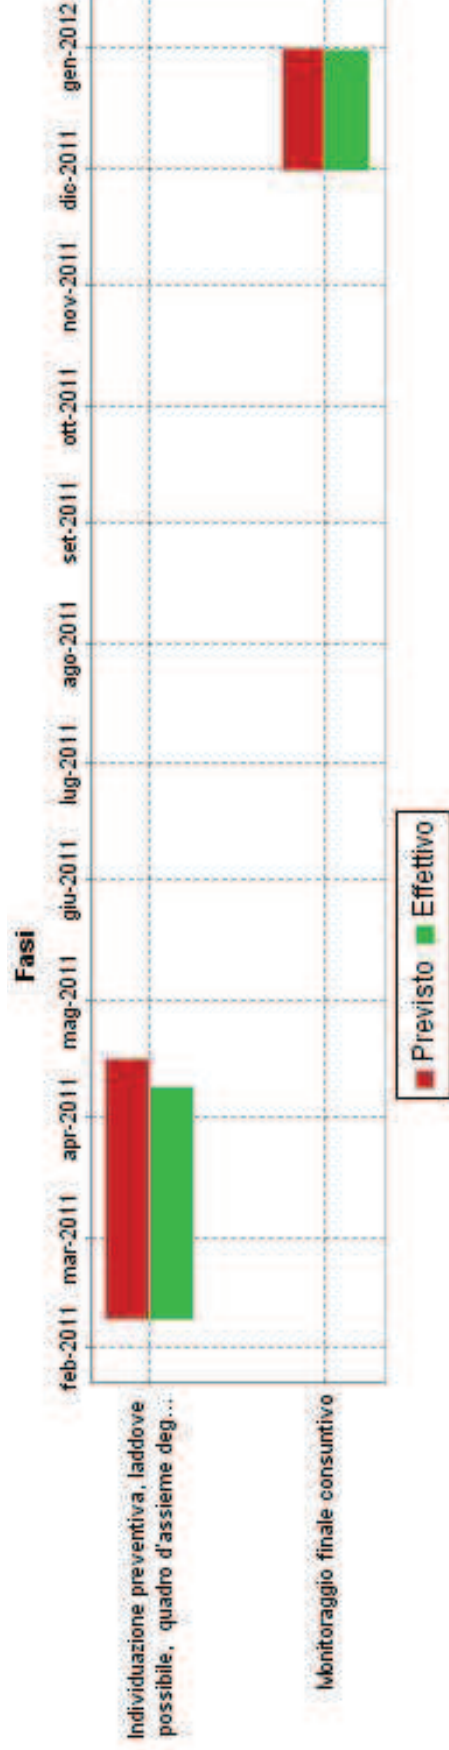

Relazione monitoraggio

Relazione all'8 aprile 2011

Lo stanziamento iniziale verrà utilizzato per la realizzazione di quanto previsto dall'obiettivo 2011_S619. Pertanto, il monitoraggio proseguirà sull'obiettivo sopra citato.

Relazione di monitoraggio al 30.06.2011

Il capitolo relativo è stato recentemente implementato, con apposita variazione di bilancio, per l'importo di €. 100.000; tale importo verrà destinato a lavori di adeguamento normativo negli istituti scolastici, che sono in corso di programmazione.

Relazione di monitoraggio al 30.12.2011

Il finanziamento complessivo dei lavori in economia, implementato durante l'anno, ha un importo complessivo di euro 531.948,00

Con questo importo sono stati realizzati o si stanno realizzando i seguenti interventi :

Palazzo della Provincia – Lavori di sistemazione spazi piano terra e interventi complementari euro 140.000,00 L'intervento è stato approvato nel suo complesso con Determina Dirigenziale n 3950 del 07/06/2011 e i lavori sono stati affidati con le seguenti Determine Dirigenziali :

Serramenti Ditta Bertone Det 5133 del 20/07/2011



2011_ S609	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI ED EDIFICI PROVINCIALI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006		

Rivestimento Ditta Giordano D.D. 6985 del 12/10/2011 Opere elettriche Tecnocivis Det. 6995 del 13/10/2011 Traslochi Ditta Bazzino Det. N 7184 del 19/10/2011 e n 8025 del 24/11/2011 Arredi Ditta Giordano D.D. 7183 del 19/10/2011 e Det 7475 del 03/11/2011 Opere Edili Tecnocivis Det 7819 del 17/11/2011 Opere Cablaggio Dime Det 8258 del 30/11/2011 L'intervento è concluso e si sta provvedendo alla liquidazione Lavori di tinteggiatura immobile via don Bosco – Savona I lavori dall'importo complessivo di euro 20.000,00 sono stati approvati con d.d. 5796 del 18/08/2011, affidati alla Ditta Accinelli di Finale Ligure e si sono completati nel mese di settembre Lavori di tinteggiatura immobile via Manzoni – Savona I lavori dall'importo complessivo di euro 20.000,00 sono stati approvati con d.d. d.d. 5795 del 18/08/2011 affidati alla Ditta Tecnocivis di Savona e si sono completati nel mese di settembre Liceo Scientifico" Bruno" Albenga – Tinteggiatura I lavori dall'importo complessivo di euro 20.000,00 sono stati approvati con d.d. 5361 del 01/08/2011. Non si è ancora provveduto all'affidamento Plesso via alla rocca – Savona tinteggiatura e impianti elettrici I lavori dall'importo complessivo di euro 20.000,00 sono stati approvati con d.d. D.D. 8697 del 15/12/2011 Non si è ancora provveduto all'affidamento Plesso via alla rocca – Lavori di risagomatura e bitumatura I lavori dall'importo complessivo di euro 49836 sono stati approvati con d.d. d.D. 8837 del 20/12/2011 Non si è ancora provveduto all'affidamento Liceo Scientifico "O.Grassi" di Savona - lavori di rifacimento rete fognaria I lavori dall'importo complessivo di euro 12.210,00 sono stati approvati con Determina Dirigenziale n 9100 del 30/12/2011. Non si è ancora provveduto all'affidamento Ad oggi si sta provvedendo a completare le stime degli interventi di risistemazione impianti elettrici ed antincendio presso il Liceo Scientifico "O.Grassi" di Savona	Responsabile Briano Franca
---	-------------------------------



2011_S610	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
Estese e sistemazione piani viabili - Programma annuale 2011 ripristino piani viabili		Responsabile Falco Renato

Estrazione Controllo Fasi Attività

Estese e sistemazione piani viabili - Programma annuale 2011 ripristino piani viabili

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras**

**RESPONSABILE
Falco Renato**



2011_S610	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
Estese e sistemazione piani viabili - Programma annuale 2011 ripristino piani viabili		Responsabile Falco Renato


OBIETTIVO: 2011_S610
Estese e sistemazione piani viabili - Programma annuale 2011 ripristino piani viabili
RESPONSABILE: Falco Renato

FASI								
Descrizione		Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
				Inizio Effettivo		Fine Effettiva	Responsabile	
Progettazione preliminare		30,00	100,00				Falco Renato	S6 - Viab./Strutt./Infras
				01/12/2010		24/01/2011		
Note								
Verifica periodica realizzabilità obiettivo		70,00	100,00	01/04/2011		10/04/2011	Falco Renato	S6 - Viab./Strutt./Infras
				01/04/2011		10/04/2011		
Note								

INDICATORI			
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
			Note



2011_S610	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
	<i>Estese e sistemazione piani viabili - Programma annuale 2011 ripristino piani viabili</i>	Responsabile Falco Renato

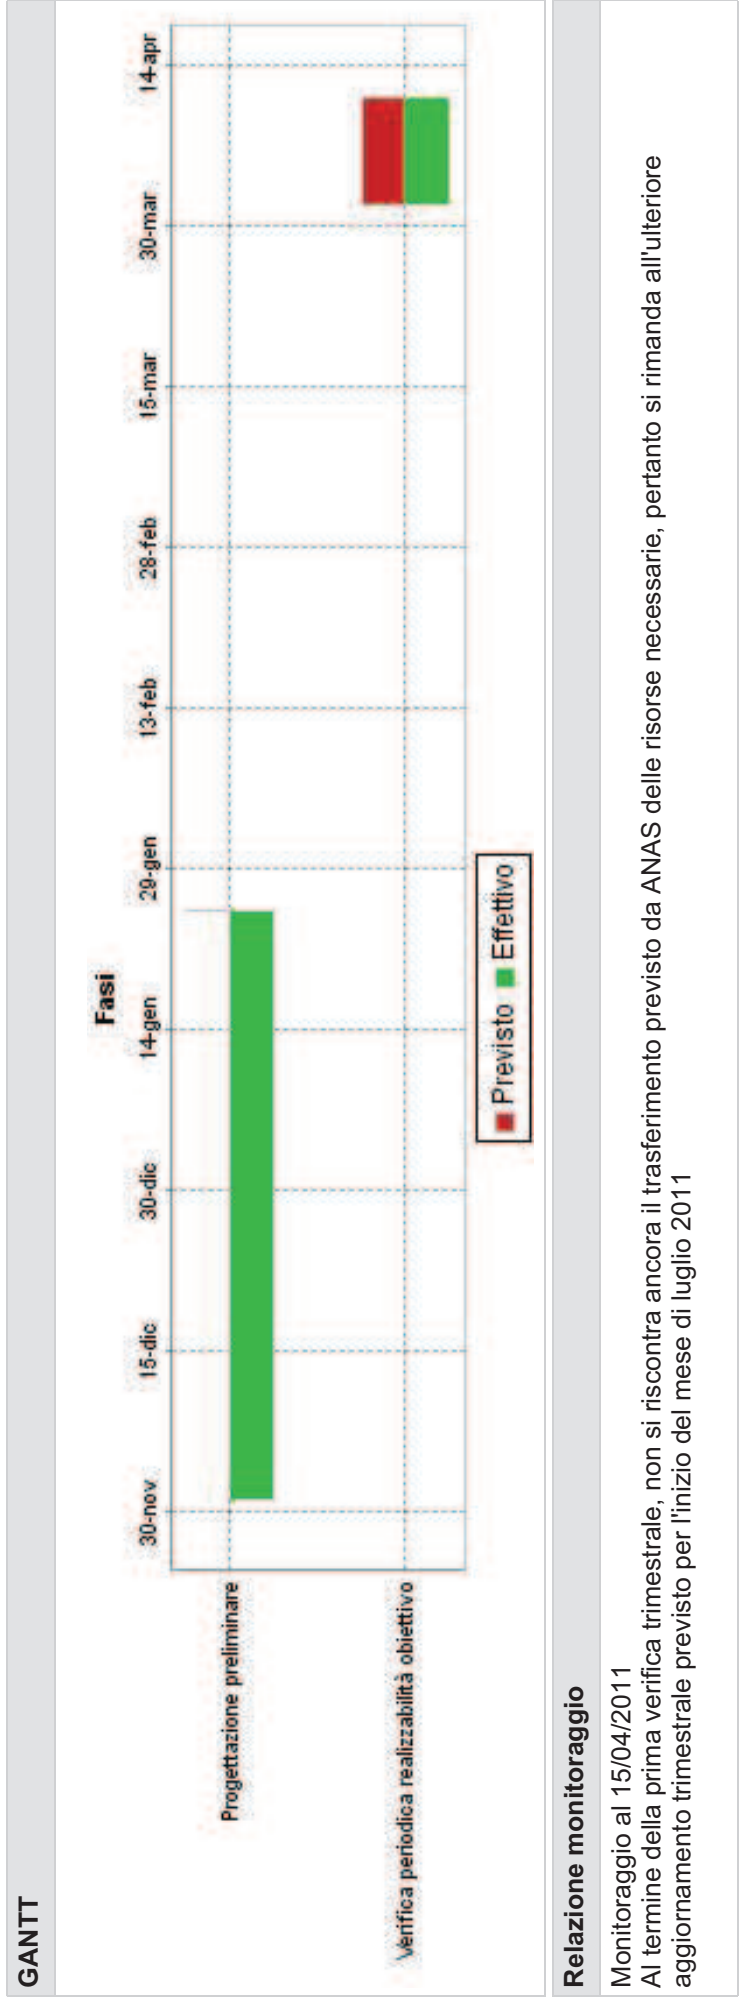



2011_S611	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
S.P. n. 490 “del Colle del Melogno” Sistemazione della rotonda nel centro abitato di Calizzano.		Responsabile Falco Renato

Estrazione Controllo Fasi Attività

S.P. n. 490 “del Colle del Melogno” Sistemazione della rotonda nel centro abitato di Calizzano.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Falco Renato



S.P. n. 490 “del Colle del Melogno” Sistemazione della rotatoria nel centro abitato di Calizzano.

OBIETTIVO: 2011 S611

S.P. n. 490 “del Colle del Melogno” Sistemazione della rotatoria nel centro abitato di Calizzano.

RESPONSABILE: Falco Renato

FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Responsabile	Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva			
Progettazione preliminare	10,00	100,00					Falco Renato	S6 - Viab./Strutt./Infras
			15/01/2007			06/02/2007		
Note								
Progettazione definitiva (possibile rielaborazione)	20,00	100,00					Falco Renato	S6 - Viab./Strutt./Infras
			07/02/2007			31/07/2007		
Note								
Progettazione esecutiva	30,00	100,00		01/04/2011		15/06/2011	Falco Renato	S6 - Viab./Strutt./Infras
				07/11/2010		14/01/2011		
Note								
Gara di appalto	5,00	100,00		16/06/2011		30/07/2011	Falco Renato	S6 - Viab./Strutt./Infras
				06/03/2011		19/04/2011		
Note								

Assessorato
Guarnieri Rosalia

2011_S611

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras**S.P. n. 490 “del Colle del Melogno” Sistemazione della rotatoria nel centro abitato di Calizzano.**Responsabile
Falco Renato

FASI						
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista	Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva	
Lavori	30,00		20/09/2011		31/12/2012	S6 - Viab./Strutt./Infras
			07/11/2011			
Note						
Collaudo e presa in carico	5,00		01/01/2013		30/03/2013	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note						
INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note		



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato
Guarnieri Rosalia


Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_S611

S.P. n. 490 “del Colle del Melogno” Sistemazione della rotatoria nel centro abitato di Calizzano.

Responsabile
Falco Renato

GANTT

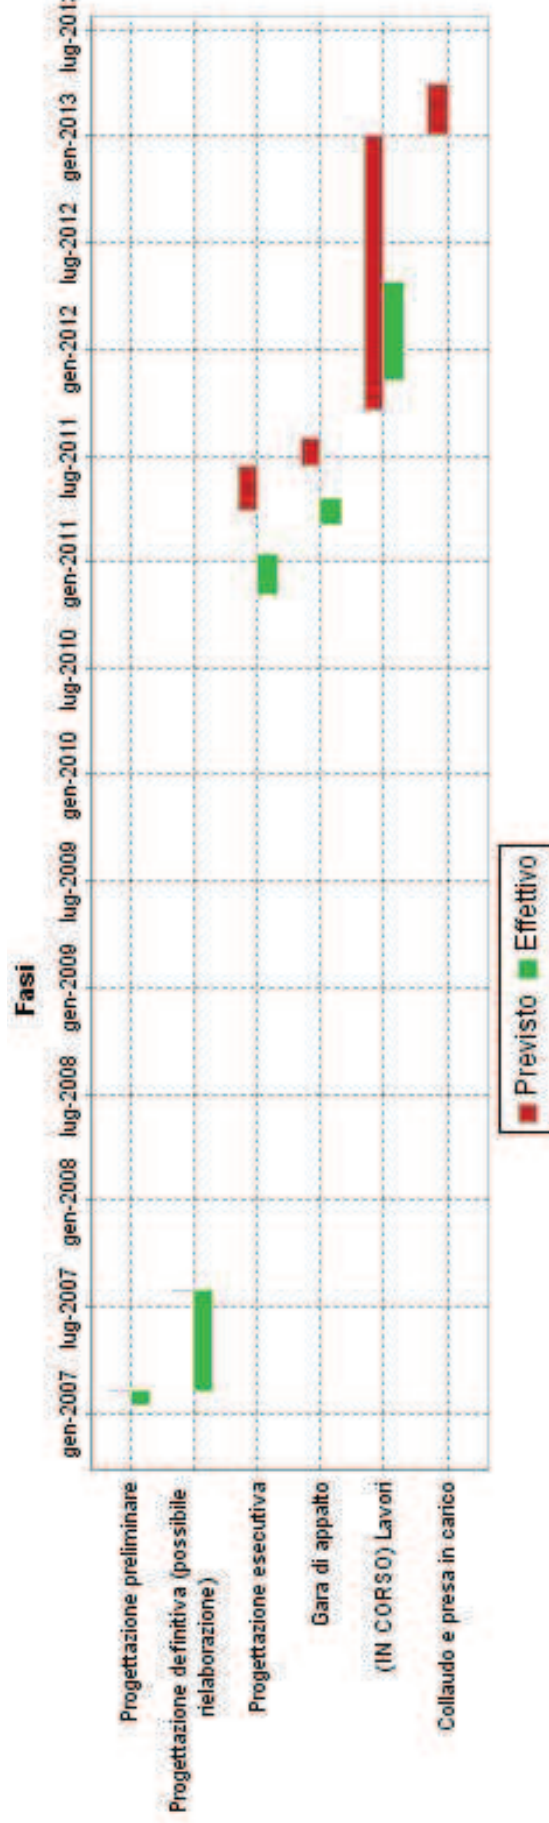

Relazione monitoraggio



2011_S612	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
S.P. n. 31 "Urbe - Pianpaludo - La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte in Loc. Olbarina al confine dei Comuni di Urbe e Sassello		Responsabile Tessitore Andrea

Estrazione Controllo Fasi Attività

S.P. n. 31 "Urbe - Pianpaludo - La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte in Loc. Olbarina al confine dei Comuni di Urbe e Sassello

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras**

**RESPONSABILE
Tessitore Andrea**



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato
Guarnieri Rosalia

2011_S612

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

S.P. n. 31 "Urbe - Pianpaludo - La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte in Loc. Olbarina al confine dei Comuni di Urbe e Sassello

Responsabile
Tessitore Andrea

OBIETTIVO: 2011_S612

S.P. n. 31 "Urbe - Pianpaludo - La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte in Loc. Olbarina al confine dei Comuni di Urbe e Sassello

RESPONSABILE: Tessitore Andrea

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Responsabile	Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Studio di fattibilità per inserimento in Programma Opere Pubbliche	10,00	100,00	03/11/2009	31/12/2009	Tessitore Andrea	S6 - Viab./Strutt./Infras		
			03/11/2009	07/12/2009				
Note								
Progettazione preliminare	30,00	100,00	10/02/2011	27/05/2011	Tessitore Andrea	S6 - Viab./Strutt./Infras		
			10/02/2011	23/05/2011				
Note								
Verifica periodica realizzabilità obiettivo	60,00	100,00	01/06/2011	10/06/2011	Tessitore Andrea	S6 - Viab./Strutt./Infras		
			01/06/2011	10/06/2011				
Note								
cfr. testo "finalità"								

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato
Guarnieri Rosalia


Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_S612

S.P. n. 31 "Urbe - Pianpaludo - La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte in Loc. Olbarina al confine dei Comuni di Urbe e Sassello

Responsabile
Tessitore Andrea

GANTT

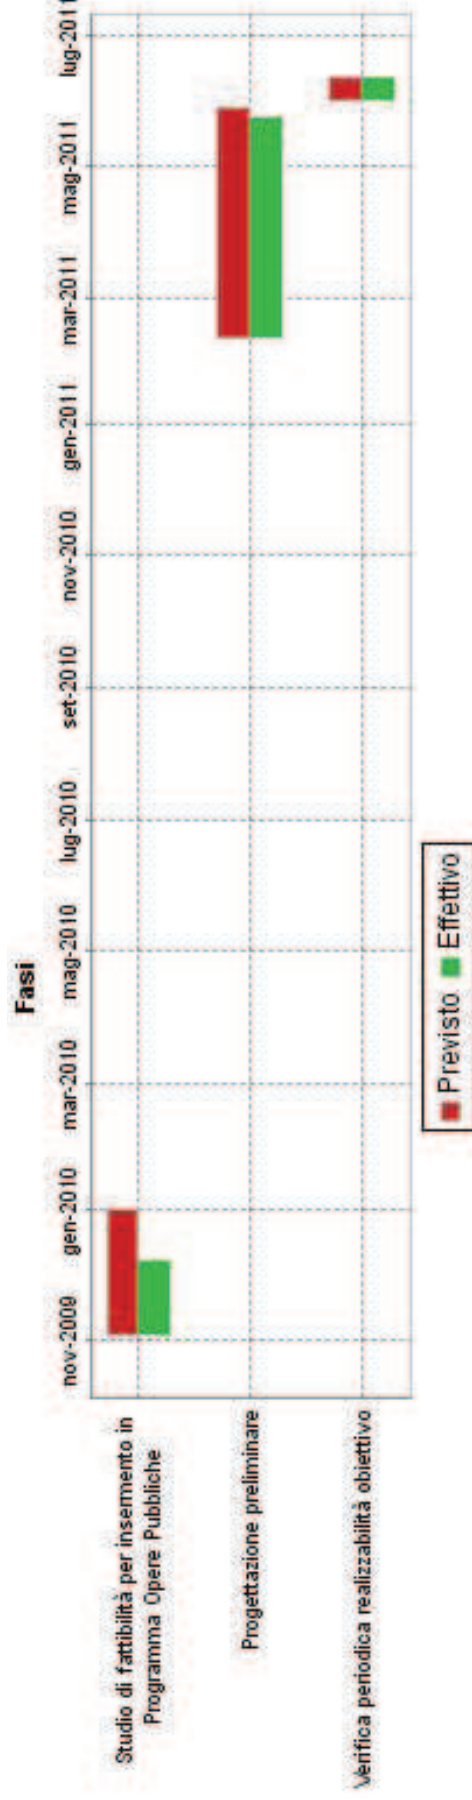

Relazione monitoraggio

Relazione monitoraggio al 10.06.2011.

Al termine della prima verifica, non si riscontra ancora il trasferimento previsto da ANAS delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, di cui è stata approvato la progettazione preliminare. Pertanto si rimanda all'ulteriore aggiornamento previsto per l'inizio del mese di settembre 2011.



2011_S613	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
Interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006.		Responsabile Pastorino Enrico

Estrazione Controllo Fasi Attività

Interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Pastorino Enrico



2011_S613	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
Interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006.		Responsabile Pastorino Enrico

OBIETTIVO: 2011_S613
Interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006.
RESPONSABILE: Pastorino Enrico

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva	Responsabile	
Individuazione preventiva del quadro d'assieme degli interventi da attuarsi nel corso dell'esercizio 2011 (prevedibili) e individuazione degli importi da mantenere a disposizione (interventi non prevedibili).	60,00	100,00	08/02/2011		20/05/2011	Pastorino Enrico	06-VIABILITA'
			08/02/2011		28/07/2011		
Note							
Monitoraggio dell'evoluzione dei lavori in economia. Quadro consuntivo.	40,00	100,00	30/11/2011		31/12/2011	Pastorino Enrico	06-VIABILITA'
			30/11/2011		30/12/2011		
Note							

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato
Guarnieri Rosalia


Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_S613

Responsabile
Pastorino Enrico

Interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006.

GANTT

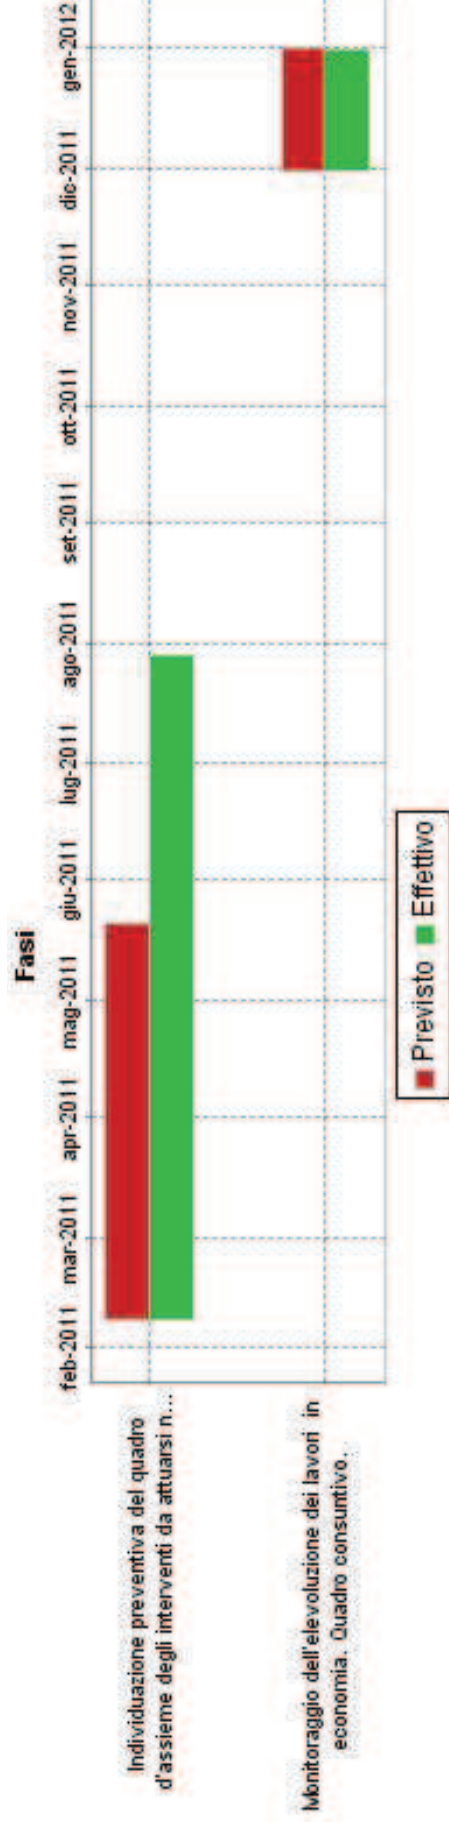

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 20.05.2011

Non è ancora stata effettuata la preventiva individuazione del quadro d'assieme, tenuto conto che buona parte delle risorse disponibili per l'attuazione dei diversi interventi è collegata al trasferimento di risorse da parte di ANAS S.p.A.

Relazione di monitoraggio al 18.07.2011

La deliberazione relativa al quadro d'assieme degli interventi da attuarsi nel corso dell'anno 2011, per quanto continui a presentare le problematiche di copertura finanziaria rilevate al 20.05.2011, è comunque stata predisposta dall'ufficio entro la metà del mese di giugno 2011 e presentata per due volte alla Giunta Provinciale, per essere ritirata in relazione sia alla individuazione degli interventi ivi previsti sia all'emergere di una situazione di particolare criticità sulle situazioni dei piani viabili delle rete stradale di competenza; tale situazione ha reso necessaria una ulteriore riflessione sulle risorse disponibili per fronteggiare lo stato di criticità: ciò ha condotto ad una rivisitazione delle previsioni del Programma OO.PP. che renderà necessaria una nuova riconfigurazione del "quadro d'assieme" dei lavori in economia prevedibili.

Relazione di monitoraggio al 28.07.2011

Con deliberazione n. 144 del 28.07.2011 la G.P. ha approvato l'elenco interventi prevedibili per l'anno 2011.



2011_S614	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
Fondi da trasferirsi ai Comuni per la realizzazione di interventi di investimenti conseguenti alla sottoscrizione di Accordi di Programma o Protocolli d'intesa.		Responsabile Pastorino Enrico

Estrazione Controllo Fasi Attività

Fondi da trasferirsi ai Comuni per la realizzazione di interventi di investimenti conseguenti alla sottoscrizione di Accordi di Programma o Protocolli d'intesa.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Pastorino Enrico



2011_S614	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
Fondi da trasferirsi ai Comuni per la realizzazione di interventi di investimenti conseguenti alla sottoscrizione di Accordi di Programma o Protocolli d'intesa.		Responsabile Pastorino Enrico


OBIETTIVO: 2011_S614 Fondi da trasferirsi ai Comuni per la realizzazione di interventi di investimenti conseguenti alla sottoscrizione di Accordi di Programma o Protocolli d'intesa.
RESPONSABILE: Pastorino Enrico

FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Responsabile	Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Trasferimento risorse al Comune	100,00		01/04/2011	30/09/2011	Pastorino Enrico	06-VIABILITA'		
Note								

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note



2011_S614	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
Fondi da trasferirsi ai Comuni per la realizzazione di interventi di investimenti conseguenti alla sottoscrizione di Accordi di Programma o Protocolli d'intesa.		Responsabile Pastorino Enrico

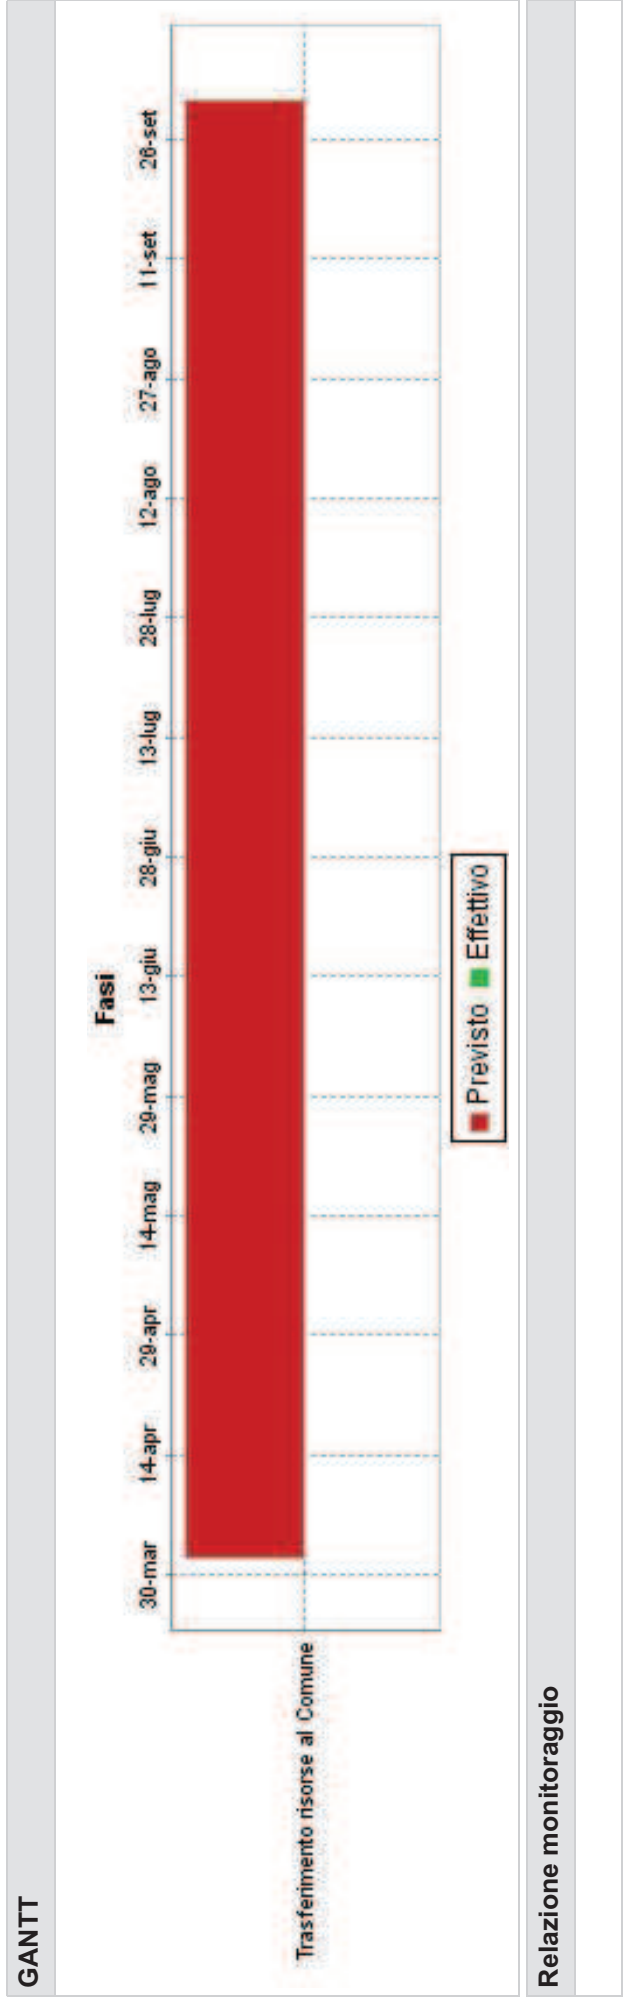



2011_S615	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
Acquisto automezzi ed attrezzature		Responsabile Pastorino Enrico

Estrazione Controllo Fasi Attività

Acquisto automezzi ed attrezzature

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Pastorino Enrico



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S615

Assessorato
Guarnieri Rosalia

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

Acquisto automezzi ed attrezzature

Responsabile
Pastorino Enrico


OBIETTIVO: 2011_S615
Acquisto automezzi ed attrezzature
RESPONSABILE: Pastorino Enrico

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva	Responsabile	
Definizione programma acquisiti e verifica fattibilità ipotesi iniziali	50,00	100,00	09/02/2011		15/04/2011	Pastorino Enrico	S6 - Viab./Strutt./Infras
					07/04/2011		
Note							
Acquisizione attrezzature	50,00	50,00	18/04/2011		31/12/2011	Pastorino Enrico	S6 - Viab./Strutt./Infras
							
Note							
Al 30 novembre è stato avviato il procedimento per l'accensione del mutuo ed al 31 dicembre 2011 si reat in attesas dell'accensione dello stesso							
INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note			



2011_S615	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
Acquisto automezzi ed attrezzature		Responsabile Pastorino Enrico

GANTT

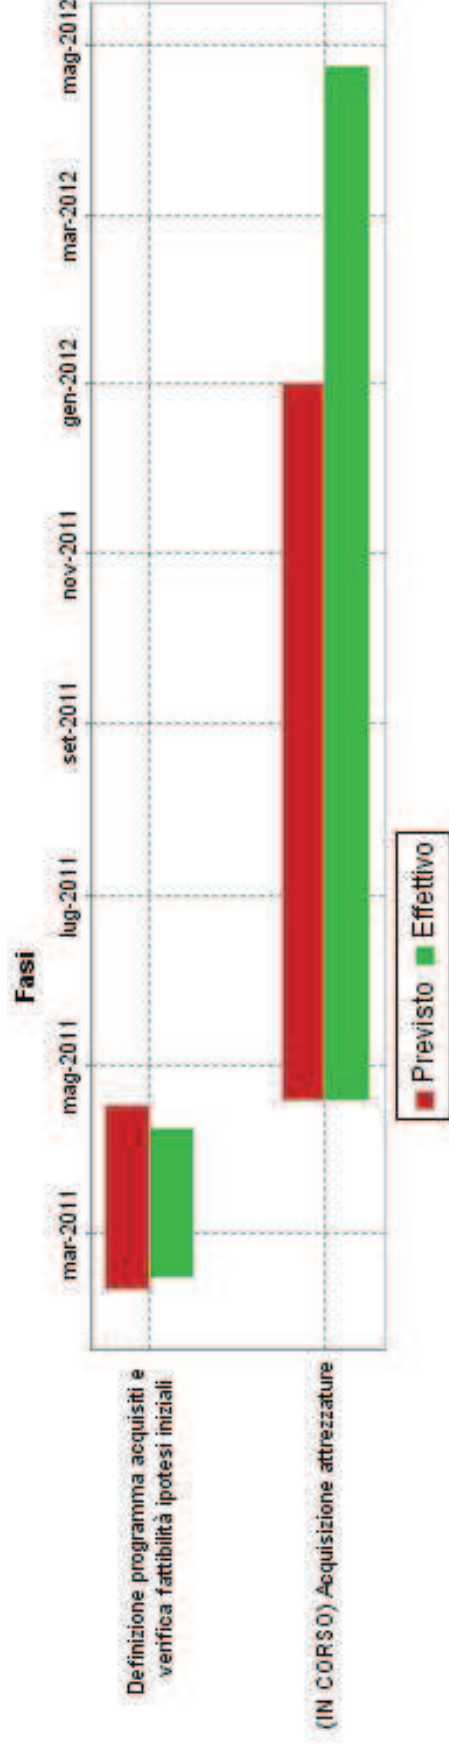

Relazione monitoraggio

Relazione monitoraggio al 31/12/2011.
Entro il 31 novembre 2011 sono stati adottati provvedimenti di definizione dei beni mobili da acquisire, che saranno acquisiti con mutuo.
Sono in corso le pratiche di accensione del mutuo che permetterà l'espletamento delle procedure di acquisizione.



2011_S617	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" DISSESTO DI VERSANTE E CHIUSURA AL TRAFFICO AL K. 14+800 IN LOCALITÀ ISOLAGRANDE. REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI.		Responsabile Falco Renato

Estrazione Controllo Fasi Attività

S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" DISSESTO DI VERSANTE E CHIUSURA AL TRAFFICO AL K. 14+800 IN LOCALITÀ ISOLAGRANDE. REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Falco Renato



2011_ S617	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
S.P. N. 51 “BORMIDA DI MILLESIMO” DISSESTO DI VERSANTE E CHIUSURA AL TRAFFICO AL K. 14+800 IN LOCALITÀ ISOLAGRANDE. REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI.		Responsabile Falco Renato

OBIETTIVO: 2011_ S617
S.P. N. 51 “BORMIDA DI MILLESIMO” DISSESTO DI VERSANTE E CHIUSURA AL TRAFFICO AL K. 14+800 IN LOCALITÀ ISOLAGRANDE. REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI.
RESPONSABILE: Falco Renato


FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Responsabile		
Esecuzione lavori somma urgenza a seguito verbale e entrata in esercizio viabilità	100,00	100,00	27/01/2011	02/04/2011	Falco Renato	S6 - Viab./Strutt./Infras	
			27/01/2011	02/04/2011			
Note							

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note



2011_S617	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
	S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" DISSESTO DI VERSANTE E CHIUSURA AL TRAFFICO AL K. 14+800 IN LOCALITÀ ISOLAGRADE. REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI.	Responsabile Falco Renato

GANTT

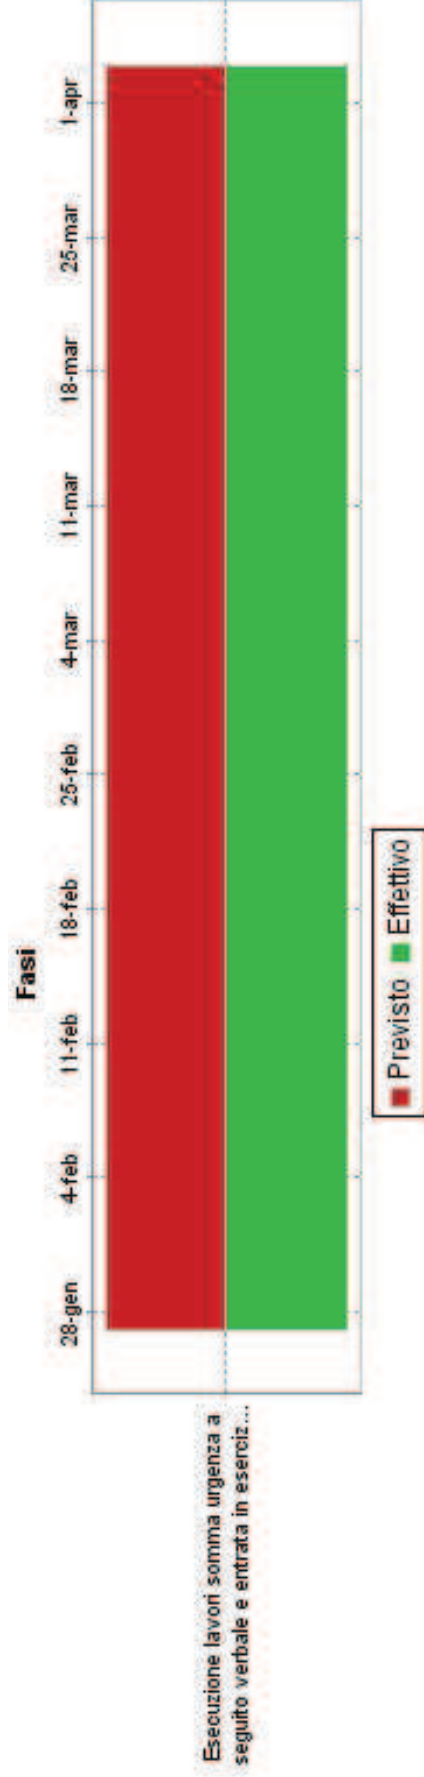

Relazione monitoraggio

Relazione al 2.04.2011

L'intervento eseguito in condizioni di somma urgenza, con verbale redatto in data 27 gennaio, è stato completato e posto in esercizio nei tempi previsti.

Rimane totalmente da risolvere il problema dell'interruzione della S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo" di cui si è resa necessaria la chiusura a causa della frana del 24.12.2010; il relativo intervento (non ancora ricompreso tra gli investimenti per l'annualità corrente) è tuttora in attesa delle risorse già stanziato dallo Stato per la Regione Liguria e che devono ancora essere ripartite tra le priorità segnalate alla stessa Amministrazione.



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S621	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
Immobile ex sede Caserma Carmana - Lavori di messa in sicurezza paramento murario lato strada		Responsabile Briano Franca

Estrazione Controllo Fasi Attività

Immobile ex sede Caserma Carmana - Lavori di messa in sicurezza paramento murario lato strada

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Briano Franca



2011_S621	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
Immobile ex sede Caserma Carmana - Lavori di messa in sicurezza paramento murario lato strada		Responsabile Briano Franca

OBIETTIVO: 2011_S621
Immobile ex sede Caserma Carmana - Lavori di messa in sicurezza paramento murario lato strada
RESPONSABILE: Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva		
affidamento lavori		100,00	11/04/2011		13/04/2011		S6 - Viab./Strutt./Infras
			11/04/2011		13/04/2011		
Note							
completamento lavori		100,00	14/04/2011		15/06/2011		S6 - Viab./Strutt./Infras
			14/04/2011		10/06/2011		
Note							
Collaudo		100,00	16/06/2011		15/07/2011		S6 - Viab./Strutt./Infras
			12/06/2011		10/07/2011		
Note							

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
ultimazione lavori	QUANTITATIVO	1,00		



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato
Guarnieri Rosalia


Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_S621

Immobile ex sede Caserma Carmana - Lavori di messa in sicurezza paramento murario lato strada

Responsabile
Briano Franca

GANTT

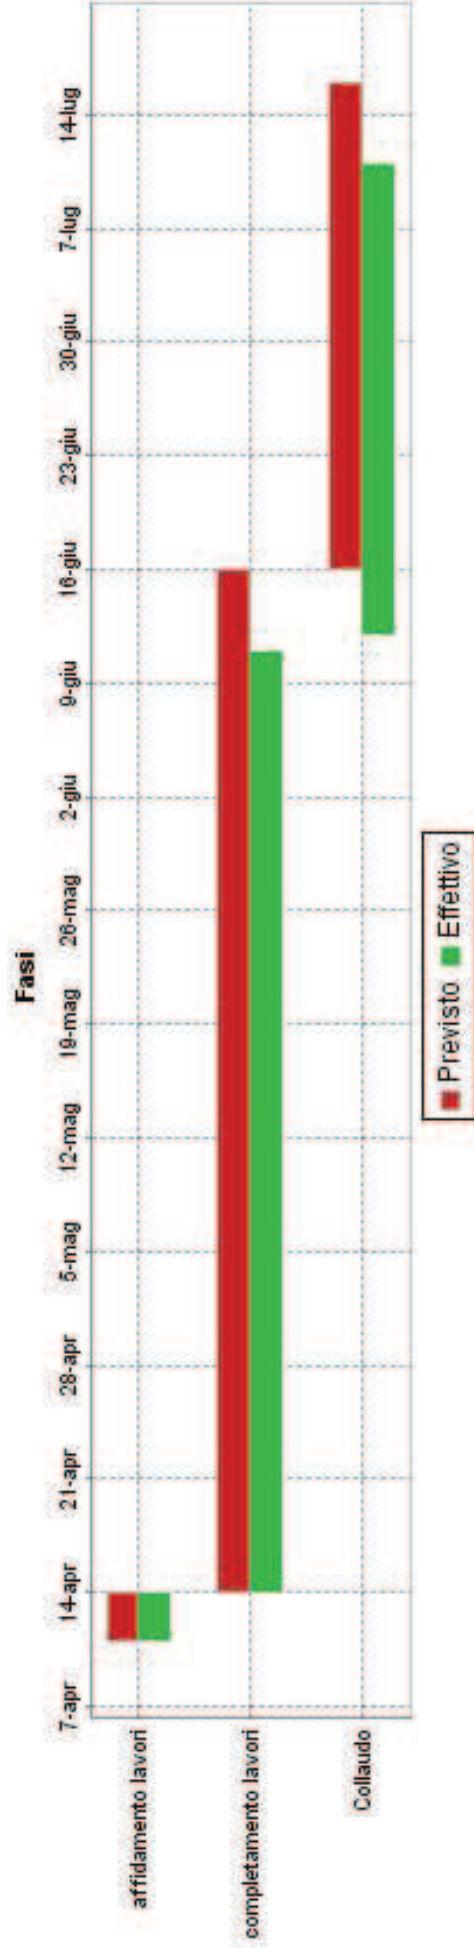

Relazione monitoraggio

Relazione monitoraggio al 10/07/2011

l'intervento, inserito in bilancio in corso d'anno è stato rapidamente affidato, in ragione del pericolo incombente per la pubblica incolumità ed è stato concluso secondo le previsioni, con certificato di regolare esecuzione in data odierna.



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S623	Assessorato Mattea Carla		Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
S.P. n. 334 "del Sassello" - Lavori di adeguamento planoaltimetrico e funzionale della strada in loc. Ferriera nuova. Intervento A: opere urgenti di consolidamento del ponte esistente in muratura in loc. Ferriera Nuova (Comune di Sassello).			Responsabile Mesiti Giulio

Estrazione Controllo Fasi Attività

S.P. n. 334 "del Sassello" - Lavori di adeguamento planoaltimetrico e funzionale della strada in loc. Ferriera nuova. Intervento A: opere urgenti di consolidamento del ponte esistente in muratura in loc. Ferriera Nuova (Comune di Sassello).

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Mesiti Giulio

Assessorato
Mattea Carla

2011_ S623

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras**S.P. n. 334 "del Sassello" - Lavori di adeguamento planoaltimetrico e funzionale della strada in loc. Ferriera nuova. Intervento A: opere urgenti di consolidamento del ponte esistente in muratura in loc. Ferriera Nuova (Comune di Sassello).**Responsabile
Mesiti Giulio**OBIETTIVO: 2011_ S623****S.P. n. 334 "del Sassello" - Lavori di adeguamento planoaltimetrico e funzionale della strada in loc. Ferriera nuova. Intervento A: opere urgenti di consolidamento del ponte esistente in muratura in loc. Ferriera Nuova (Comune di Sassello).****RESPONSABILE: Mesiti Giulio****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Responsabile	Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva			
Progettazione preliminare		100,00	02/05/2011		29/07/2011		Mesiti Giulio	S6 - Viab./Strutt./Infras
			02/05/2011		05/07/2011			
Note								
Redazione progettazione definitiva			01/08/2011		16/10/2011		Mesiti Giulio	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note								
Vedi testo monitoraggio al 31-12-2011								
Espletamento Conferenza servizi ed approvazione progettazione definitiva			17/10/2011		30/12/2011		Mesiti Giulio	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note								
Progettazione esecutiva			02/01/2012		20/02/2012		Mesiti Giulio	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note								



Assessorato
Mattea Carla

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_ S623

S.P. n. 334 "del Sassello" - Lavori di adeguamento planoaltimetrico e funzionale della strada in loc. Ferriera nuova. Intervento A:opere urgenti di consolidamento del ponte esistente in muratura in loc. Ferriera Nuova (Comune di Sassello).

Responsabile
Mesiti Giulio

FASI									
Descrizione		Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Responsabile	Centro di Responsabilità
				Inizio Effettivo		Fine Effettiva			
Gara di appalto				21/02/2012		30/03/2012		Mesiti Giulio	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note									
Lavori				01/06/2012		31/12/2012		Mesiti Giulio	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note									
Collaudo e presa in carico				01/01/2013		01/04/2013		Mesiti Giulio	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note									
INDICATORI									
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note				



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato
Mattea Carla


Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_S623

S.P. n. 334 "del Sassello" - Lavori di adeguamento planaltimetrico e funzionale della strada in loc. Ferriera nuova. Intervento A: opere urgenti di consolidamento del ponte esistente in muratura in loc. Ferriera Nuova (Comune di Sassello).

Responsabile
Mesiti Giulio

GANTT

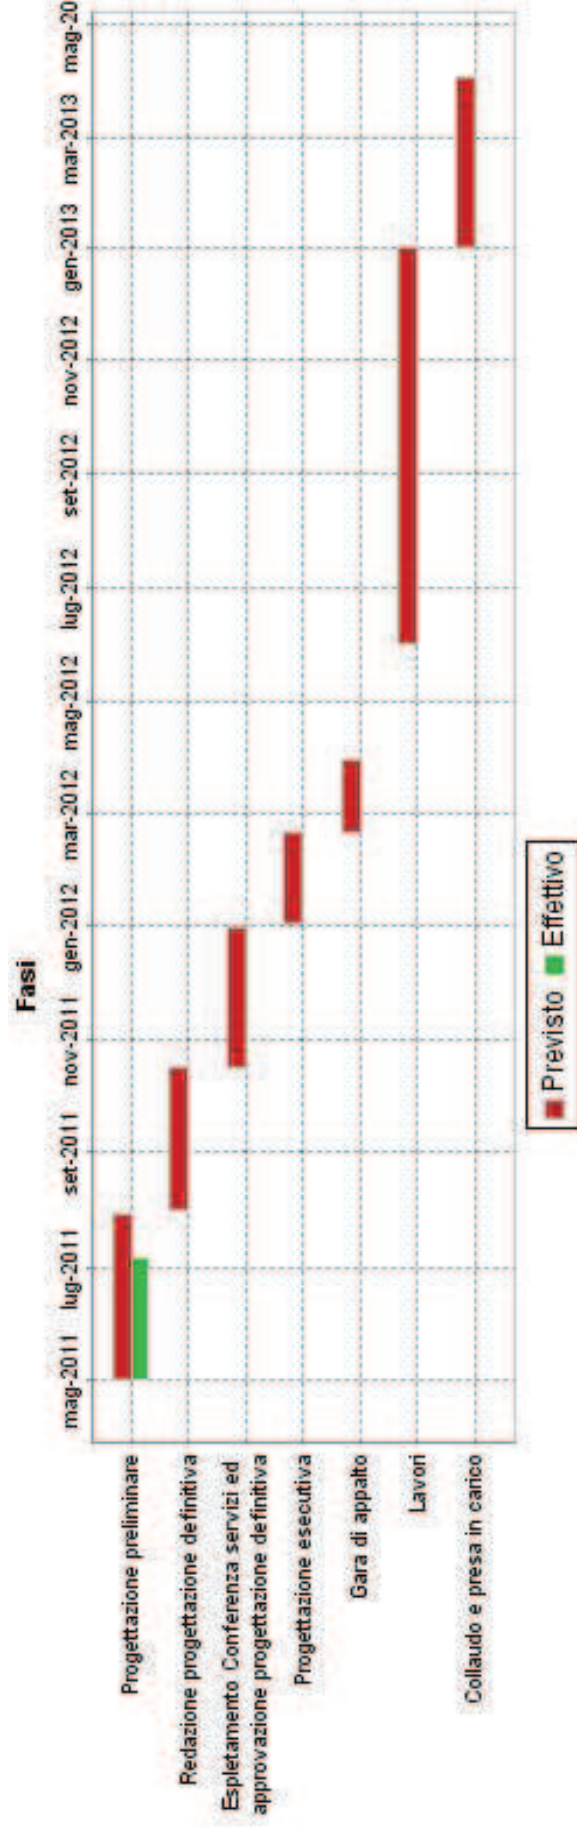

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 29.07.2011

Monitoraggio al 31-12-2011

In data 02-08-2011 è stata emessa l'Ordinanza sindacale del Comune di Sassello n. 32, la quale prescrive alla Provincia di Savona, "di provvedere, entro 30 giorni dalla notificazione (...), a ripristinare le condizioni di sicurezza del ponte (...), mediante l'attuazione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità (...)".

A seguito della predetta ordinanza, in data 03-08-2011 è stato compilato dal RUP un verbale per esecuzione lavori in condizioni di urgenza, relativamente alla parte di interventi, già previsti nella progettazione di cui sopra, strettamente necessari alla messa in sicurezza del ponte, da eseguirsi, per i motivi esplicitati nel predetto verbale, prima della stagione invernale.

La rimanente parte di interventi potrà procedere mediante un iter ordinario, e riguarderà a questo punto solamente la parte relativa alle opere di finitura, di rifacimento della sovrastruttura stradale e di sostituzione delle barriere di sicurezza.

La parte di lavori urgenti, di importo complessivo 268.000,00 €, è stata consegnata in via d'urgenza in data 13-09-2011, ed è ad oggi in corso di ultimazione.



2011_S623	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
S.P. n. 334 "del Sassello" - Lavori di adeguamento planaltimetrico e funzionale della strada in loc. Ferriera nuova. Intervento A: opere urgenti di consolidamento del ponte esistente in muratura in loc. Ferriera Nuova (Comune di Sassello).		

La progettazione della rimanente parte, dovendo tener conto della parte di interventi già eseguiti, partirà non appena terminati gli interventi urgenti stessi.



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S624	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
PALAZZO PROVINCIA - LAVORI DI RISISTEMAZIONE SPAZI PIANO TERRA E INTERVENTI COMPLEMENTARI - EURO 140.000,00		Responsabile Briano Franca

Estrazione Controllo Fasi Attività

**PALAZZO PROVINCIA - LAVORI DI RISISTEMAZIONE SPAZI PIANO TERRA E
INTERVENTI COMPLEMENTARI - EURO 140.000,00**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras**

**RESPONSABILE
Briano Franca**




2011_S624	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
PALAZZO PROVINCIA - LAVORI DI RISISTEMAZIONE SPAZI PIANO TERRA E INTERVENTI COMPLEMENTARI - EURO 140.000,00		Responsabile Briano Franca

OBIETTIVO: 2011_S624
PALAZZO PROVINCIA - LAVORI DI RISISTEMAZIONE SPAZI PIANO TERRA E INTERVENTI COMPLEMENTARI - EURO 140.000,00
RESPONSABILE: Briano Franca

FASI								
Descrizione		Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
				Inizio Effettivo		Fine Effettiva	Responsabile	
mmmm		30,00					Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note								

INDICATORI			
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
			Note





2011_ S624	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
PALAZZO PROVINCIA - LAVORI DI RISISTEMAZIONE SPAZI PIANO TERRA E INTERVENTI COMPLEMENTARI - EURO 140.000,00		

Relazione monitoraggio
Relazione all'8 aprile 2011 Lo stanziamento verrà utilizzato per la realizzazione di quanto previsto dall'obiettivo 2011_S619. Pertanto, il monitoraggio (fasi ed indicatori) proseguirà sull'obiettivo sopra citato, mentre il presente resta soltanto per memoria della parte "lavori" dell'obiettivo stesso, quale enucleazione dell'intervento dal complessivo budget a disposizione dell'obiettivo S609.



2011_S625	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FACCIAE E CORNICIONI		Responsabile Briano Franca

Estrazione Controllo Fasi Attività

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FACCIAE E CORNICIONI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Briano Franca



2011_S625	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FACCIAE E CORNICIONI		Responsabile Briano Franca

OBIETTIVO: 2011_S625		
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FACCIAE E CORNICIONI		
RESPONSABILE: Briano Franca		


FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva		100,00	26/07/2011	01/08/2011	01/08/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			26/07/2011				
Note							
Progettazione esecutiva		100,00	30/10/2011	31/12/2011	20/12/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			12/09/2011				
Note							
Gara di appalto			01/01/2012	28/02/2012		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
			21/12/2011				
Note							
Lavori			15/04/2012	30/06/2012		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note							

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FACCIAE E CORNICIONI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Responsabile		
Collaudo e presa in carico			01/07/2012	31/07/2012	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras	
Note							

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
n. 1 progetto esecutivo	QUANTITATIVO	0,00		

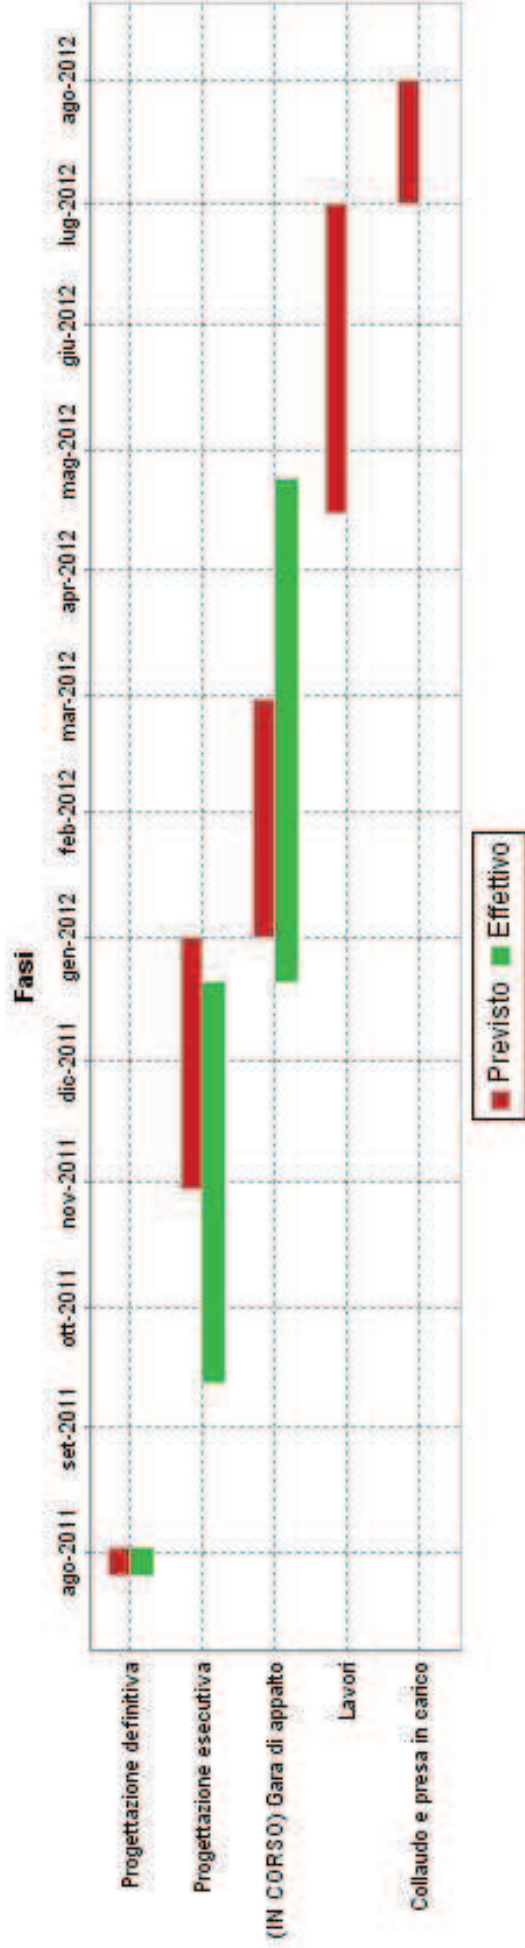GANTT



Assessorato
Guarnieri Rosalia

2011_S625

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

Responsabile
Briano Franca

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FACCIAE E CORNICIONI

Relazione al 01/08/2011

L'intervento è stato finanziato dal CIPE all'intervno del programma stralcio per lavori interni sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi. Il progetto definitivo è stato approvato con Determina Dirigenziale n 5365 del 01/08/2011. Come prevedeva la convenzione, a seguito di approvazione, lo stesso è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture per il parere

Relazione al 13/09/2011

A seguito di parere positivo del Ministero delle infrastrutture n 6933 del 12/09/2011 si sta provvedendo alla predisposizione del progetto esecutivo.

Relazione al 20/12/2011

Con Determina Dirigenziale n 8832 del 20/12/2011 è stato approvato il progetto esecutivo. L'attivazione delle procedure di gara avverrà successivamente all'erogazione del contributo da parte del Ministero



LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Responsabile
Briano Franca

Estrazione Controllo Fasi Attività

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Briano Franca



2011_S626

Responsabile
Briano Franca**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO**

OBIETTIVO: 2011_S626	
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	
RESPONSABILE: Briano Franca	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva		
Progettazione definitiva		100,00	26/07/2011		01/08/2011		S6 - Viab./Strutt./Infras
			26/07/2011		19/08/2011		
Note							
Progettazione esecutiva		100,00	01/10/2011		31/12/2011		S6 - Viab./Strutt./Infras
			01/10/2011		21/12/2011		
Note							
Vedi relazione al 21/12/2011							
Gara di appalto			01/01/2012		28/02/2012		S6 - Viab./Strutt./Infras
			22/12/2011				
Note							
Lavori			15/04/2012		30/06/2012		S6 - Viab./Strutt./Infras
Note							

Assessorato
Guarnieri Rosalia


2011_S626

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./InfrasResponsabile
Briano Franca**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO**

FASI									
Descrizione		Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista	Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità
				Inizio Effettivo					
Collaudo e presa in carico				01/07/2012		31/07/2012		Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras
Note									

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. 1 progetto esecutivo	QUANTITATIVO	0,00		

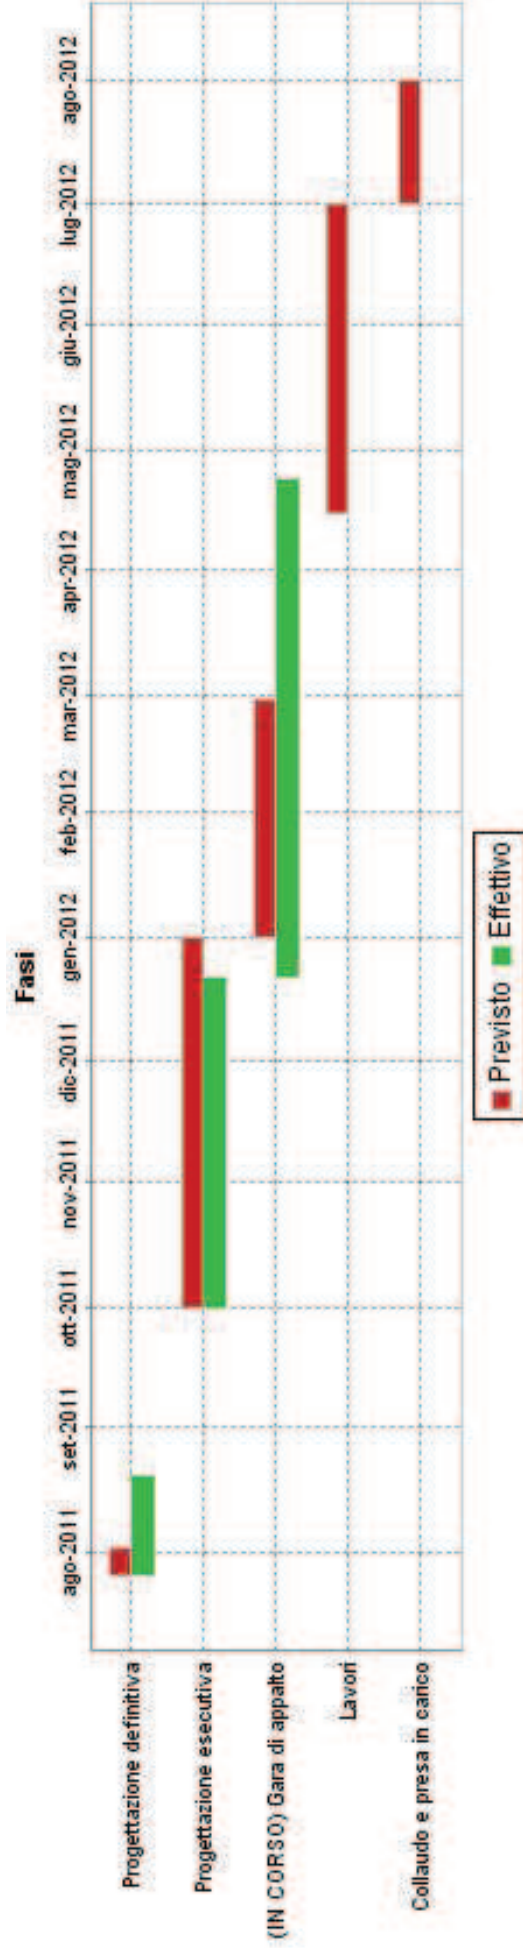GANTT



Assessorato
Guarnieri Rosalia

2011_S626

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

Responsabile
Briano Franca

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO**Relazione monitoraggio**

Relazione al 19/08/2011

In data 19/08/2011 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento. Detto progetto è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per richiesta di parere

Relazione al 13/09/2011

A seguito di parere favorevole sull'intervento rilasciato dal Ministero per le Infrastrutture (n. 6932 del 12 settembre 2011) si sono attivate le procedure per la predisposizione della progettazione esecutiva.

Relazione al 21/12/2011

Con Determina Dirigenziale n 8857 del 21/12/2011 è stato approvato il progetto esecutivo. L'attivazione delle procedure di gara avverrà successivamente all'erogazione del contributo da parte del Ministero



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S627	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VOLTE E DEGLI ARCONI PRESENTI NELLO STABILE DI LEVANTE		Responsabile Briano Franca

Estrazione Controllo Fasi Attività

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VOLTE E DEGLI ARCONI PRESENTI
NELLO STABILE DI LEVANTE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Briano Franca



2011_ S627	Assessorato Guarnieri Rosalia	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VOLTE E DEGLI ARCONI PRESENTI NELLO STABILE DI LEVANTE		Responsabile Briano Franca

OBIETTIVO: 2011_ S627
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VOLTE E DEGLI ARCONI PRESENTI NELLO STABILE DI LEVANTE
RESPONSABILE: Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva		Responsabile	
Approvazione relazione tecnica e computo metrico e affidamento lavori		100,00	27/07/2011	03/08/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras	
			27/07/2011	01/08/2011			
Note							
Vedi relazione al 01/08/2011							
Collaudo e presa in carico			04/10/2011	15/10/2011	Briano Franca	S6 - Viab./Strutt./Infras	
			 16/12/2011				
Note							
V. relazione al 30/12/2011							

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
lavori conclusi	QUANTITATIVO	0,00		



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato
Guarnieri Rosalia


Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_S627

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VOLTE E DEGLI ARCONI PRESENTI NELLO STABILE DI LEVANTE

Responsabile
Briano Franca

GANTT

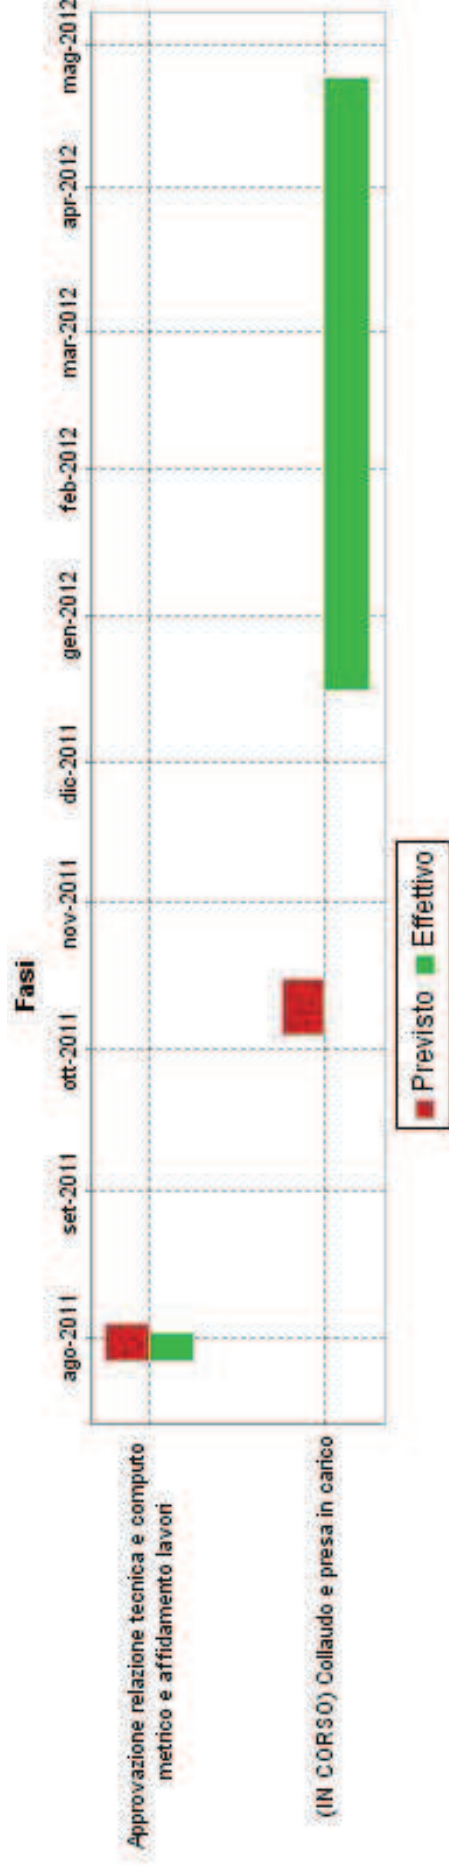

Relazione monitoraggio

Relazione al 01/08/2011

Come da determina dirigenziale del 28/07/2011 n 5287 si è provveduto con Verbale del 01/08/2011 a consegnare i lavori all'Impresa Sacchi di Savona.

Relazione al 16/12/2011

I lavori sono terminati in data odierna, il ritardo rispetto alle previsioni delle tempistiche è da imputarsi alla necessità di effettuare una variante alle lavorazioni causa modifiche all'intervento delle quali se ne è riscontata la necessità solo durante le lavorazioni (diversa tipologia strutturale evidenziata solo in fase di demolizione). Pertanto i lavori sono stati sospesi dal 14/09/2011 al 30/11/2011.

Relazione al 30/12/2011

I lavori sono terminati in data 16/12/2011

La maggior parte dei locali sono già in uso alla scuola, le operazioni di collaudo verranno completate al primo stop didattico



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S628	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
SP 57 - Varazze - Loc. Casanova_Rio Dei Galli - Evento calamitoso 4.10.2010 - spese tecniche per progettazione n. 2 interventi - finanziamento regionale Decreto Commissario Delegato n.176_2011		Responsabile Pastorino Enrico

Estrazione Controllo Fasi Attività

SP 57 - Varazze - Loc. Casanova_Rio Dei Galli - Evento calamitoso 4.10.2010 - spese tecniche per progettazione n. 2 interventi - finanziamento regionale Decreto Commissario Delegato n.176_2011

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Pastorino Enrico



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S628	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
SP 57 - Varazze - Loc. Casanova_Rio Dei Galli - Evento calamitoso 4.10.2010 - spese tecniche per progettazione n. 2 interventi - finanziamento regionale Decreto Commissario Delegato n.176_2011		Responsabile Pastorino Enrico

OBIETTIVO: 2011_S628									
SP 57 - Varazze - Loc. Casanova_Rio Dei Galli - Evento calamitoso 4.10.2010 - spese tecniche per progettazione n. 2 interventi - finanziamento regionale Decreto Commissario Delegato n.176_2011									
RESPONSABILE: Pastorino Enrico									
FASI									
Descrizione		Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità		
Progettazione preliminare					31/01/2012	Mesiti Giulio	S6 - Viab./Strutt./Infras		
Note				08/11/2011					
Progettazione definitiva				01/02/2012	30/04/2012	Mesiti Giulio	S6 - Viab./Strutt./Infras		
Note									
INDICATORI									
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note					



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato
Mattea Carla


Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

2011_S628

SP 57 - Varazze - Loc. Casanova_Rio Dei Galli - Evento calamitoso 4.10.2010 - spese tecniche per progettazione n. 2 interventi - finanziamento regionale Decreto Commissario Delegato n.176_2011

Responsabile
Pastorino Enrico

GANTT

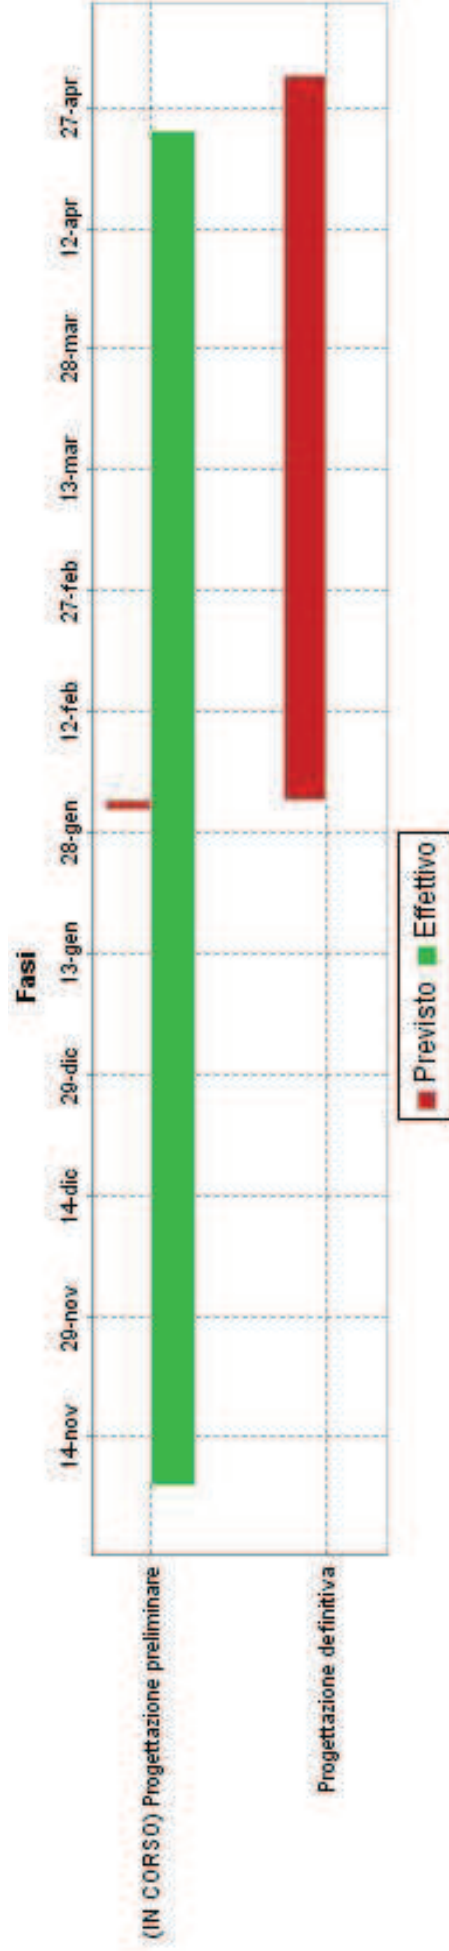

Relazione monitoraggio



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S629	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
PNSS 2003 - SP 334 "Del Sassello" Spese tecniche per Studio Fattibilità miglioramento sicurezza stradale (proposta rimodulata nel 2011) - finanziamento Decreto Interministeriale n. 794_2009 - quota a carico Provincia (v. Acc. n. 2010/1736 cumulativo)		Responsabile Pastorino Enrico

Estrazione Controllo Fasi Attività

PNSS 2003 - SP 334 "Del Sassello" Spese tecniche per Studio Fattibilità miglioramento sicurezza stradale (proposta rimodulata nel 2011) - finanziamento Decreto Interministeriale n. 794_2009 - quota a carico Provincia (v. Acc. n. 2010/1736 cumulativo)

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Pastorino Enrico




2011_S629	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
PNSS 2003 - SP 334 "Del Sasselo" Spese tecniche per Studio Fattibilità miglioramento sicurezza stradale (proposta rimodulata nel 2011) - finanziamento Decreto Interministeriale n. 794_2009 - quota a carico Provincia (v. Acc. n. 2010/1736 cumulativo)		

OBIETTIVO: 2011_S629									
PNSS 2003 - SP 334 "Del Sasselo" Spese tecniche per Studio Fattibilità miglioramento sicurezza stradale (proposta rimodulata nel 2011) - finanziamento Decreto Interministeriale n. 794_2009 - quota a carico Provincia (v. Acc. n. 2010/1736 cumulativo)									
RESPONSABILE: Pastorino Enrico									
FASI									
Descrizione	Studio di fattibilità	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Responsabile	Centro di Responsabilità
				Inizio Effettivo		Fine Effettiva			
				14/09/2011		30/04/2012			
S6 - Viab./Strutt./Infras									
Note									
INDICATORI									
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note				



2011_S629	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
PNSS 2003 - SP 334 "Del Sasselo" Spese tecniche per Studio Fattibilità miglioramento sicurezza stradale (proposta rimodulata nel 2011) - finanziamento Decreto Interministeriale n. 794_2009 - quota a carico Provincia (v. Acc. n. 2010/1736 cumulativo)		Responsabile Pastorino Enrico

GANTT

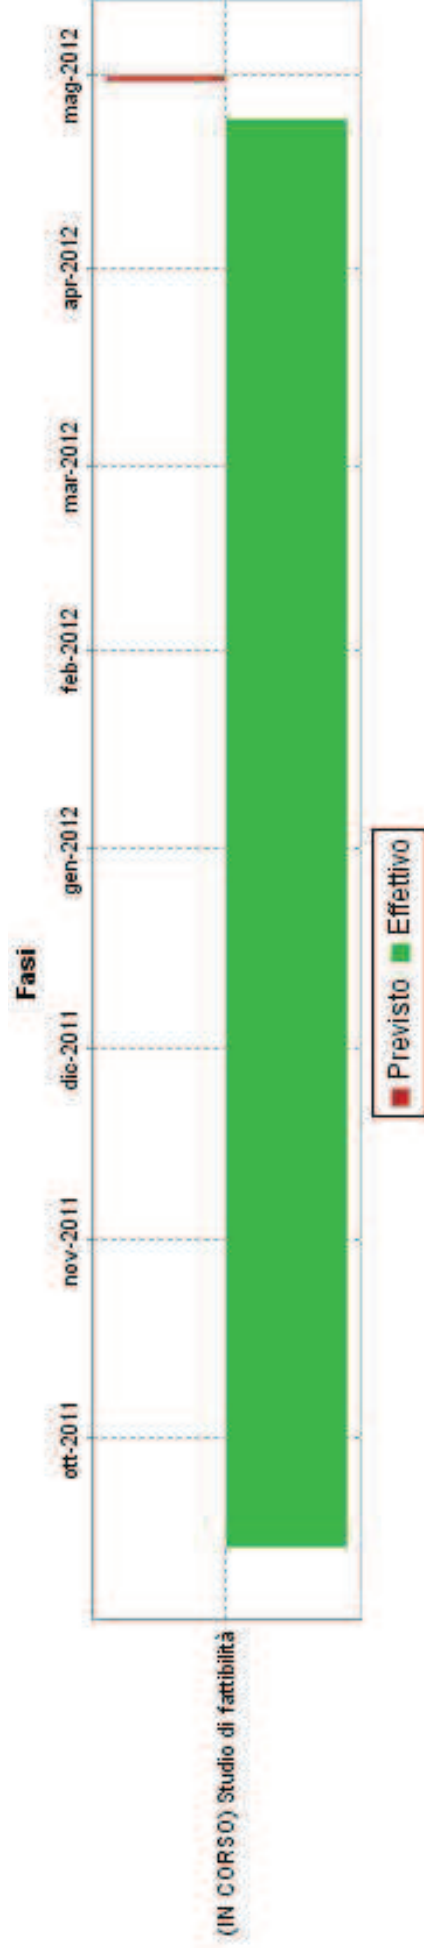

Relazione monitoraggio



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S630	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
SP "51 Bormida di Millesimo" Spese tecniche per progettazione interventi finalizzati alla mitigazione del rischio derivante dagli eventi di cui all'OCPM n. 3909/2010		Responsabile Pastorino Enrico

Estrazione Controllo Fasi Attività

SP "51 Bormida di Millesimo" Spese tecniche per progettazione interventi finalizzati alla mitigazione del rischio derivante dagli eventi di cui all'OCPM n. 3909/2010

CENTRO DI RESPONSABILITA'
S6 - Viab./Strutt./Infras

RESPONSABILE
Pastorino Enrico



Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Centro di Responsabilità
S6 - Viab./Strutt./Infras

Responsabile
Pastorino Enrico

SP "51 Bormida di Millesimo" Spese tecniche per progettazione interventi finalizzati alla mitigazione del rischio derivante dagli eventi di cui all'OCPM n. 3909/2010

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Responsabile	Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva			
Predisposizione progettazione preliminare.	60,00		12/12/2011		15/03/2012		Falco Renato	S6 - Viab./Strutt./Infras
			12/12/2011					
Note								
Predisposizione progettazione definitiva.	40,00		19/03/2012		30/05/2012		Falco Renato	S6 - Viab./Strutt./Infras


Descrizione

Note



2011_S630	Assessorato Mattea Carla	Centro di Responsabilità S6 - Viab./Strutt./Infras
SP "51 Bormida di Millesimo" Spese tecniche per progettazione interventi finalizzati alla mitigazione del rischio derivante dagli eventi di cui all'OCPM n. 3909/2010		Responsabile Pastorino Enrico

GANTT

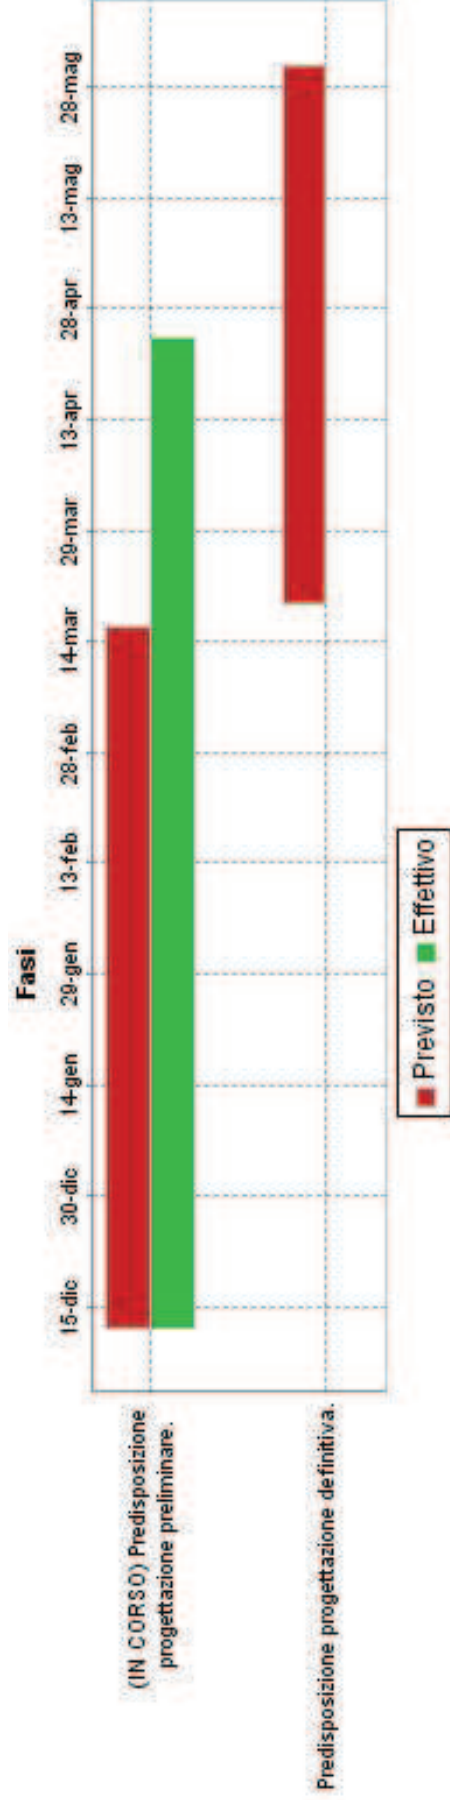

Relazione monitoraggio



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S809	Assessorato Marson Paolo	Centro di Responsabilità S8 - Territorio/Ambiente
<i>Progetto integrato della rete sentieristica dei parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri</i>		Responsabile Genta Paolo

Estrazione Controllo Fasi Attività

Progetto integrato della rete sentieristica dei parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S8 - Territorio/Ambiente**

**RESPONSABILE
Genta Paolo**



2011_S809	Assessorato Marson Paolo	Centro di Responsabilità S8 - Territorio/Ambiente
Progetto integrato della rete sentieristica dei parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri		Responsabile Genta Paolo

OBIETTIVO: 2011_S809		
Progetto integrato della rete sentieristica dei parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri		
RESPONSABILE: Genta Paolo		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Centro di Responsabilità
			Inizio Effettivo		Fine Effettiva	Responsabile	
Progettazione esecutiva		100,00	20/04/2011		30/06/2011		S8 - Territorio/Ambiente
			20/04/2011		29/06/2011		
Note							
Gara di appalto			01/07/2011		31/12/2011		S8 - Territorio/Ambiente
			30/06/2011				
Note							
vedi relazione monitoraggio							

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011


Assessorato
Marson Paolo

Centro di Responsabilità
S8 - Territorio/Ambiente

2011_S809

Progetto integrato della rete sentieristica dei parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri
Responsabile
Genta Paolo

GANTT

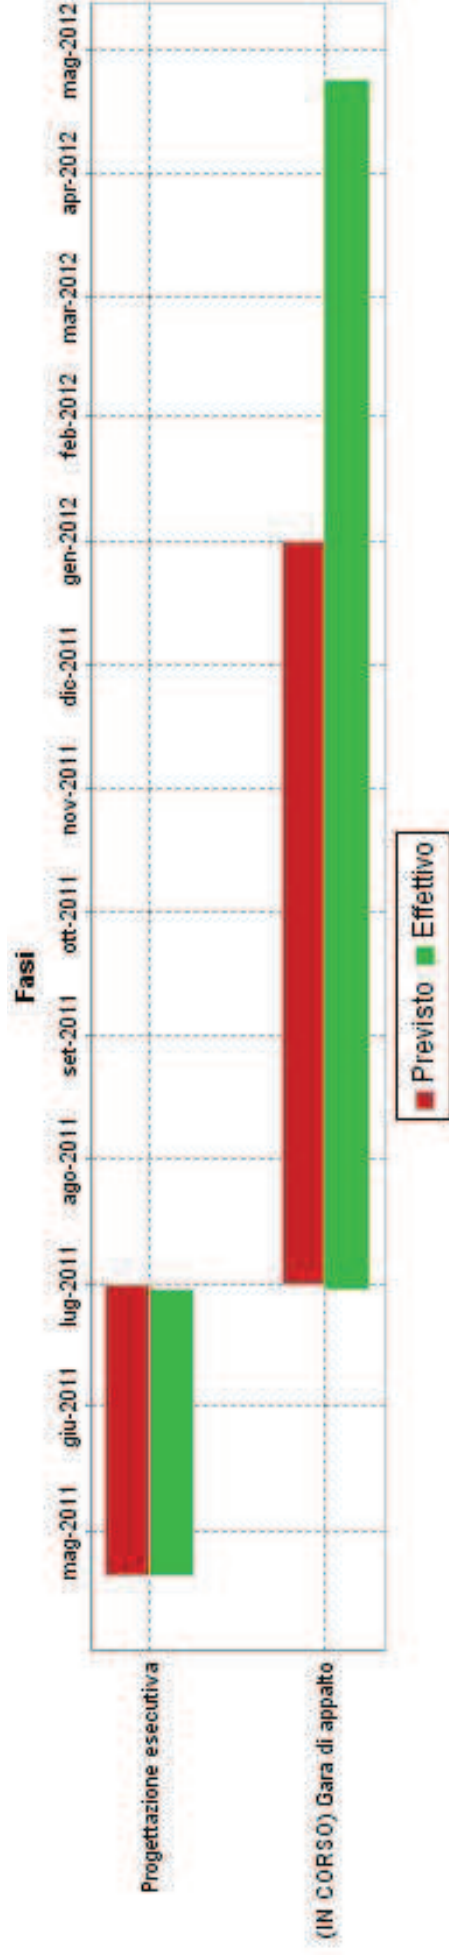

Relazione monitoraggio

Relazione al 30/06/2011

I progettisti incaricati della progettazione hanno consegnato nei termini previsti dal disciplinare di incarico gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva del progetto. Dopo una prima verifica di conformità effettuata dall'Ufficio Parchi, in data 29/06/2011 si è provveduto a richiedere al Servizio Procedure Concertative dell'Ente l'indizione di apposita conferenza per la valutazione congiunta del progetto da parte di tutti i soggetti interessati dall'esecuzione degli interventi.

Relazione al 31/12/2011

In carenza di impegno formale da parte di Regione Liguria per l'erogazione delle risorse finanziate con fondi F.A.S. (Fondi Aree Sottoutilizzate), non si è dato avvio alle procedure di gara per l'individuazione dell'appaltatore dei lavori.



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

Assessorato
Marson Paolo

Centro di Responsabilità
S8 - Territorio/Ambiente

2011_S814

**RIFACIMENTO TRATTO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE TREXENDA IN
COMUNE DI QUILIANO**

Responsabile
Ferro Paola

Estrazione Controllo Fasi Attività

**RIFACIMENTO TRATTO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE
TREXENDA IN COMUNE DI QUILIANO**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S8 - *Territorio/Ambiente***

**RESPONSABILE
*Ferro Paola***



2011_S814	Assessorato Marson Paolo	Centro di Responsabilità S8 - Territorio/Ambiente
RIFACIMENTO TRATTO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE TREXENDA IN COMUNE DI QUILIANO		Responsabile Ferro Paola

OBIETTIVO: 2011_S814 RIFACIMENTO TRATTO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE TREXENDA IN COMUNE DI QUILIANO
RESPONSABILE: Ferro Paola

FASI									
Descrizione		Peso	Avanz.	Inizio Previsto		Fine Prevista		Responsabile	Centro di Responsabilità
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Approvazione progetto preliminare				19/08/2011	15/12/2011				S8 - Territorio/Ambiente
				19/08/2011					
Note									

INDICATORI			
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note



Provincia di Savona

Estrazione Controllo Fasi Attività 2011

2011_S814


Assessorato
Marson Paolo

Centro di Responsabilità
S8 - Territorio/Ambiente

**RIFACIMENTO TRATTO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE TREXENDA IN
COMUNE DI QUILIANO**

Responsabile
Ferro Paola

GANTT

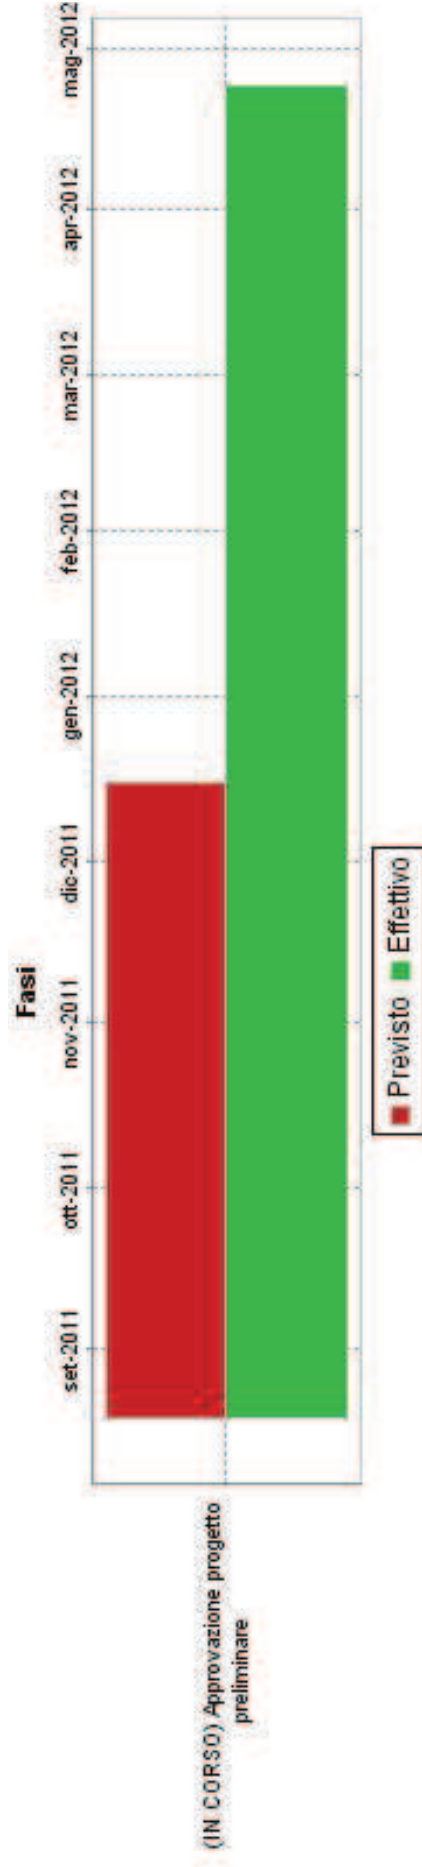

Relazione monitoraggio
